


RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jun/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	HERVAL D'OESTE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	60/2021	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	08/07/2021	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	28/06/2023
Prorrogação de prazo (dias):	347	Prazo de execução com prorrog.:	09/06/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$11.465.196,19	Valor liberado do CFF:	R\$10.506.910,56
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.118.323,79	Valor liberado de acréscimos:	R\$2.118.323,79
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.141.261,09	Valor descontado (supressões):	R\$990.830,31
% de aditivos de acréscimo:	18,48%	% de aditivos de supressão:	9,95%
Valor total final da obra:	R\$12.442.258,89	Valores totais liberados:	R\$11.634.404,04
Valores à liberar:	R\$807.854,85	% Executado (sobre o valor final):	93,51%
Área construída:	3390,81 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:

Aguardando vistoria final

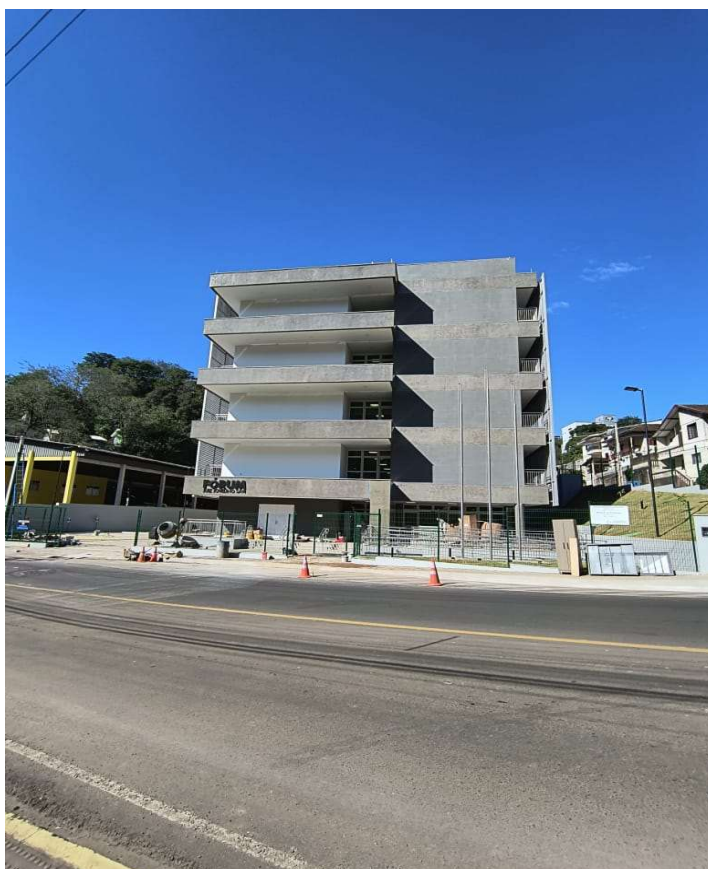

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjsc.jus.br/transparencia/portal/#/consultar/licitacao/detalhes/licitacao/epuW1LcmfUj3z93b0C0E1L2MqglC7b5X8c0V293c7v7E1e0b10mf3bWu0DcmF7Y8G0jckw6dGub66AlC7b32DcmF3MwW3r1p0Cv0D2u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jun/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CAMPO ERÊ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	77/2021	Reforma Global e Ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	23/09/2021	Empresa Responsável:	Constr. Faon Ltda
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	17/12/2022
Prorrogação de prazo (dias):	600	Prazo de execução com prorrog.:	08/08/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$3.218.369,52	Valor liberado do CFF:	R\$1.947.786,98
Valor de aditivos de Acréscimo:	R\$189.807,65	Valor liberado de Acréscimos:	R\$115.882,47
Valor de aditivos de supressões:	R\$75.066,01	Valor descontado (supressões):	R\$33.055,59
% de aditivos de Acréscimo:	5,90%	% de aditivos de supressão:	2,33%
Valor total final da obra:	R\$3.333.111,16	Valores totais liberados:	R\$2.030.613,86
Valores à liberar:	R\$1.302.497,30	% Executado (sobre o valor final):	60,92%
Área construída:	763,42 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc-theme.saf.br/transparencia/jornal/consultar/obras/SantanaLitoranea/syujwV1omR1Ub3HhcC85U33eMkLc0xarBQzrh8cIvR75uqjlyqmF4WUua300mF7W80JutwI8C7wbV8I8UJLC8J300mF2M9V7Cg00v9C2m>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jun/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	IMBITUBA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	002/2022	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	04/03/2022	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi
Prazo contratual (dias):	960	Prazo de execução original:	19/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	17/01/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$19.801.812,59	Valor liberado do CFF:	R\$15.557.736,19
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.434.523,04	Valor liberado de acréscimos:	R\$1.071.848,78
Valor de aditivos de supressões:	R\$2.428.949,78	Valor descontado (supressões):	R\$2.297.668,92
% de aditivos de acréscimo:	12,29%	% de aditivos de supressão:	12,27%
Valor total final da obra:	R\$19.807.385,85	Valores totais liberados:	R\$14.331.916,05
Valores à liberar:	R\$5.475.469,80	% Executado (sobre o valor final):	72,36%
Área construída:	6.495,02 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/jornal/8/consultar/obras/Sma/hnt/Lctacao/vlydW1LomRUB3hbcS5U4NtL1CtB3BwQZhbGh72Fvjqr8cmP4wUuaN0cmf1TW8Ghw6dGlyv65d4L1CtB3N0cmfAMW5jg0cvfW2u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jun/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	SÃO LOURENÇO DO OESTE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	054/2022	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	17/01/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	780	Prazo de execução original:	07/03/2025
Prorrogação de prazo (dias):	15	Prazo de execução com prorrogação:	22/03/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$17.217.900,00	Valor liberado do CFF:	R\$9.198.110,69
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$25.127,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	-R\$162.075,13	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,15%	% de aditivos de supressão:	-0,94%
Valor total final da obra:	R\$17.405.102,13	Valores totais liberados:	R\$9.198.110,69
Valores à liberar:	R\$8.206.991,44	% Executado (sobre o valor final):	52,85%
Área construída:	3.077,49 m²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultarlicitacao/detaillicitacao/ejbdw11cmrl5b3fbb20800USNTEI1C0aX8-CQ2h86hV75af0eRyemF43Wu3XNDcmF#WBQ0idwtdGubv66Al1Ch3NDcmF4uW5rjg0v76>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jun/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	GARUVA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	003/2023	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	06/03/2023	Empresa Responsável:	Construtora Triade Ltda
Prazo contratual (dias):	600	Prazo de execução original:	26/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	25/12/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$14.151.254,90	Valor liberado do CFF:	R\$10.960.408,30
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$27.503,76	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$34.171,91	Valor descontado (supressões):	R\$34.171,91
% de aditivos de acréscimo:	0,19%	% de aditivos de supressão:	0,24%
Valor total final da obra:	R\$14.144.586,75	Valores totais liberados:	R\$10.926.236,39
Valores à liberar:	R\$3.218.350,36	% Executado (sobre o valor final):	77,25%
Área construída:	2427,37 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/jornal/8/consultar/obras/5648481/licitacao/51504011/0m9Lub3R0bC8SUSATQdCbaXbuQzPhGdH7Fu0j0y0mF36Wsu0D0mFYW8/Diaria/5C1wby6HJAJL/CB320mPMUWUjgDc/cvRQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		jun/24	
Unidade Beneficiada:	ARAQUARI	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	17/2023	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	25/05/2023	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	900	Prazo de execução original:	10/11/2025
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	09/01/2026
Valor do CFF original da obra:	R\$19.714.211,41	Valor liberado do CFF:	R\$4.686.972,78
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$958.914,39	Valor liberado de acréscimos:	R\$784.258,88
Valor de aditivos de supressões:	R\$680.530,93	Valor descontado (supressões):	R\$641.070,48
% de aditivos de acréscimo:	4,86%	% de aditivos de supressão:	3,45%
Valor total final da obra:	R\$19.992.594,87	Valores totais liberados:	R\$4.830.161,18
Valores à liberar:	R\$15.162.433,69	% Executado (sobre o valor final):	24,16%
Área construída:	3840,29 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:



<https://tjpc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultar/licitacao/detalhes/licitacao/xyku4M11cm8U3z8N808QyeAD0Y1C0Q43xU0Z8N808PZ8u08y0emR8MfUaXNDcmFR8M8Dju8ei8Gub8y88d8d8L1Ch3N8cm8A8W8y8g8c8v8Q8u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jun/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	JOINVILLE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	051/2023	Reforma parcial (glazing)	
Data da Ordem de Serviço:	30/11/2023	Empresa Responsável:	Belart Tec. Em Constr. Ltda
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	29/03/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	29/03/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$240.412,50	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$240.412,50	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$240.412,50	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	9.422,75 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:

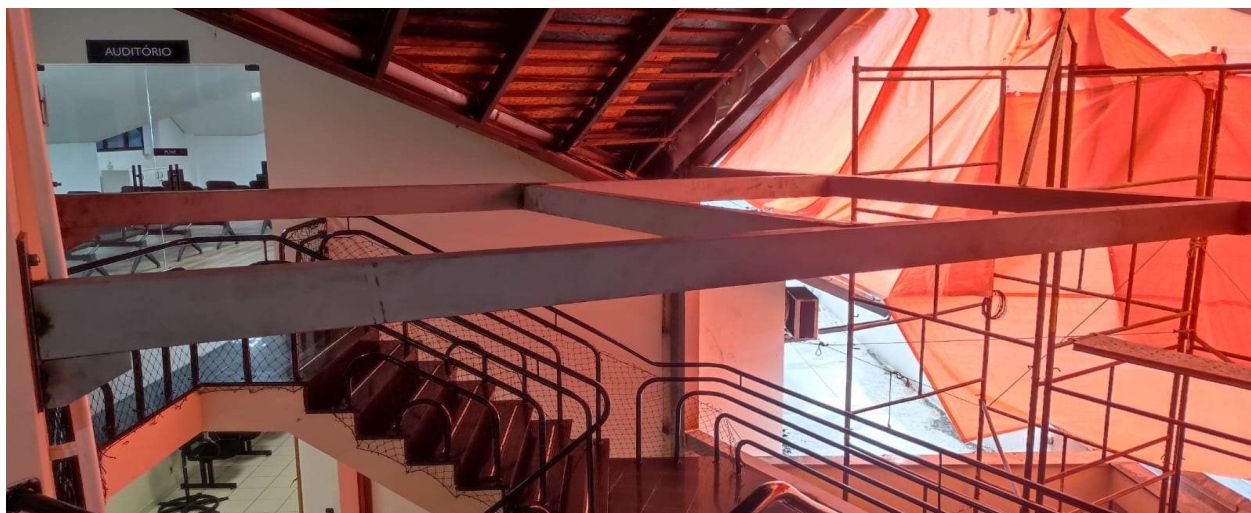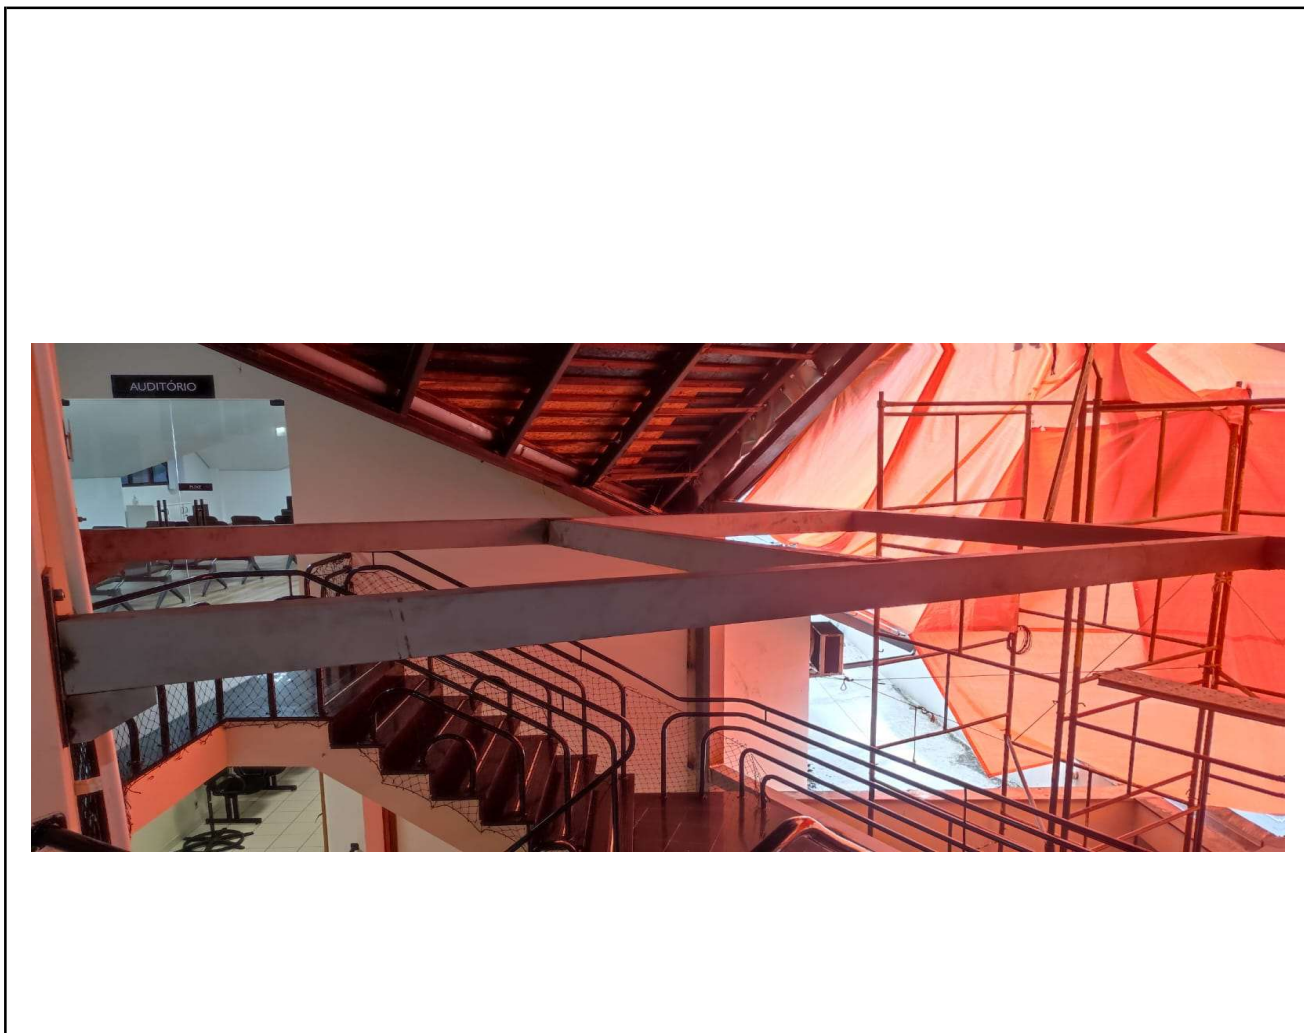

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjsc.jus.br/transparencia/portal/#/consultarlicitacao/detalheslicitacao/eyJ0Wj1kcmU6b3R5bG90eWVhMDE1Cm9kX2V2Z2h0b29mF3ZjWuW2N0cmF3W8D0ubw4dG0wbyB0aU41CjRlN0N0cmF3Mw5Scj0oQy0yDQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			jun/24
Unidade Beneficiada:	NORTE DA ILHA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	064/2023	Reforma parcial	
Data da Ordem de Serviço:	20/11/2023	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	19/03/2024
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	17/06/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$2.063.996,46	Valor liberado do CFF:	R\$846.101,61
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$156.765,69	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$21.621,09	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	7,60%	% de aditivos de supressão:	1,05%
Valor total final da obra:	R\$2.199.141,06	Valores totais liberados:	R\$846.101,61
Valores à liberar:	R\$1.353.039,45	% Executado (sobre o valor final):	38,47%
Área construída:	1.982,34 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultalicitacao/detalheslicitacao/eyJpW11cmRlLjRhbG0iVWFrAklC0aXBlCkZhbG0iYm90aWwzNDcmFVW80kxkxwS0wby6tAklC0z1NDcmFASW3rjip0cVlT2u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

Diretoria-Geral Administrativa
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO **jun/24**

Unidade Beneficiada:	ITAPOÁ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	001/2024	Reforma parcial e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	08/04/2024	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	05/09/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	05/09/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.089.859,74	Valor liberado do CFF:	R\$228.429,94
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.089.859,74	Valores totais liberados:	R\$228.429,94
Valores à liberar:	R\$861.429,80	% Executado (sobre o valor final):	20,96%
Área construída:	380,36 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc-theme.sbf.br/transparencia/jportal/#!/consultarContrato/GetAtivoContrato/cv1225127W3uW8QDnM32hwzWb5m7p7d6qMdyKcNcm5124WwVby65f8Q==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

Diretoria-Geral Administrativa
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC

jun/24

Unidade Beneficiada:	BLUMENAU	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	005/2024	Reforma Global	
Data da Ordem de Serviço:	09/05/2024	Empresa Responsável:	Implanta Const., Inc. e Serv.
Prazo contratual (dias):	900	Prazo de execução original:	26/10/2026
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	26/10/2026
Valor do CFF original da obra:	R\$20.740.327,86	Valor liberado do CFF:	R\$151.995,24
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$20.740.327,86	Valores totais liberados:	R\$151.995,24
Valores à liberar:	R\$20.588.332,62	% Executado (sobre o valor final):	0,73%
Área construída:	10121,23 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.thema.inf.br/bramseproca/portal/#/consultar-obras/gerar-hei/licitacao/cadastramento/tribunais/tribunal-de-justica-de-santa-catarina/diretoria-de-engenharia-e-arquitetura>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jun/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	SÃO JOSÉ - ANEXO	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	026/2024	Reforma parcial (reforço estrutural e nova cobertura)	
Data da Ordem de Serviço:	10/06/2024	Empresa Responsável:	Berkana Engenharia
Prazo contratual (dias):	270	Prazo de execução original:	07/03/2025
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	07/03/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$2.999.975,08	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$2.999.975,08	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$2.999.975,08	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	5.753,64 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/jportal/!consultarContrato!Seta@hscContrato!qv!ZF!Z!W!u!W!E!D!M!U!U!w!D!H!c!m!p!D!u!o!M!y!w!C!m!1!2!R!V!y!e!E!z!h!e!>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jun/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	S. AMARO DA IMPERATRIZ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	033/2024	Estabilização de talude	
Data da Ordem de Serviço:	28/06/2024	Empresa Responsável:	Freedom Eng. e Constr. Ltda.
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	23/06/2025
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	23/06/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$4.284.134,63	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$4.284.134,63	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$4.284.134,63	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	761,25 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento.

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc-theme.tjf.br/transparentencia/portal/#/consultarContrato/detalhesContrato/av1242322?tab=WEGDhM4y19i0w7203icm3e721u00M4y0W4em5140V0y616M4000>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA

jun/24

Unidade Beneficiada:	JOINVILLE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	006/2020	Reforma parcial (cobertura, brises, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	14/10/2020	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	420	Prazo de execução original:	08/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	316	Prazo de execução com prorrog.:	20/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$1.646.374,66	Valor liberado do CFF:	R\$1.646.374,66
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$221.286,10	Valor liberado de acréscimos:	R\$221.286,10
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	13,44%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.867.660,76	Valores totais liberados:	R\$1.867.660,76
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	9.422,75 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 28/07/2023

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 28/07/2023 e definitivamente em 23/05/2024.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjbr.com.br/transparentacao/portal/#/consultarlicitacao/detalheslicitacao/epu/W1Lm0tUjB3b0010111Nqg1-C0uX0R-y0X7b0C0Y7F-c0u0b0m0f0b0W-uXN0Dc-mFYW0B0h0k0w0G0w0y0t0001-C0h03D0m0F0M0W0k0p0c0v0D0u0>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	jun/24
---	---------------

Unidade Beneficiada:	BLUMENAU	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	022/2022	Reforma para finalização do 3º e 4º pavimento e urbanização	
Data da Ordem de Serviço:	15/08/2022	Empresa Responsável:	J. M. Gato Const. Inc. Ltda
Prazo contratual (dias):	270	Prazo de execução original:	12/05/2023
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	11/07/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$5.269.376,46	Valor liberado do CFF:	R\$5.269.376,46
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$25.604,01	Valor liberado de acréscimos:	R\$25.604,01
Valor de aditivos de supressões:	R\$41.408,30	Valor descontado (supressões):	R\$41.408,30
% de aditivos de acréscimo:	0,49%	% de aditivos de supressão:	0,79%
Valor total final da obra:	R\$5.253.572,17	Valores totais liberados:	R\$5.253.572,17
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	10121,23 m²	Desenvolvimento:	Concluída em 18/08/2023

Situação da Obra:

Recebida provisoriamente em 18/08/2023 e definitivamente em 09/02/2022.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:


https://tsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultar/licitacao/detalhes/licitacao/epu0W1Lcmfu3381b0101145NAU_C0a38-4n372b017F7e0a8b10m1630uXND-mEYWE8Ck1w0G1e0v6E1A4C1b3N1DcmEMUW5j1p0c0vYQ...

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA
jun/24

Unidade Beneficiada:	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	028/2023	Reforma parcial do Fórum - PPCI	
Data da Ordem de Serviço:	16/06/2023	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	14/09/2023
Prorrogação de prazo (dias):	116	Prazo de execução com prorrog.:	08/01/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$473.830,67	Valor liberado do CFF:	R\$473.830,67
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$37.287,48	Valor liberado de acréscimos:	R\$37.287,48
Valor de aditivos de supressões:	R\$6.170,32	Valor descontado (supressões):	R\$6.170,32
% de aditivos de acréscimo:	7,87%	% de aditivos de supressão:	1,30%
Valor total final da obra:	R\$504.947,83	Valores totais liberados:	R\$504.947,83
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	5.693,66 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 12/12/2023

Situação da Obra:

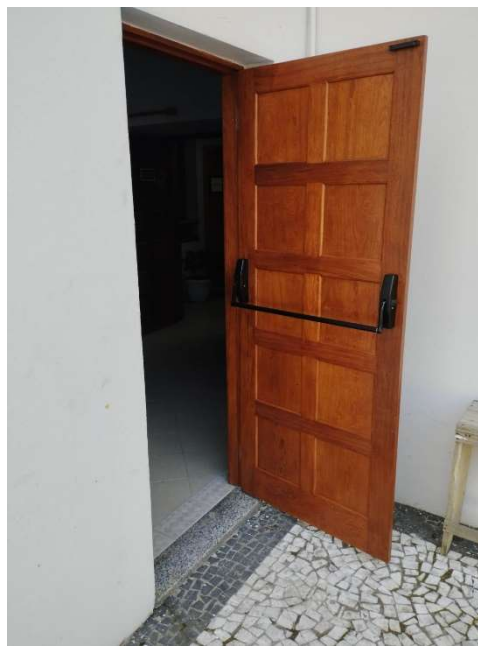Recebida provisoriamente em 12/12/2023 e definitivamente em 11/04/2024

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/jornal/3/consultar/obra/SemAhuLctacasa/vyjdW1LomRiub38bc36lrwArMILC0xarBQz7hc3lrr7ZgublyoimF4Wua30dmrF7W8D0urw6dClwy6jllALCrb38dmrF4Wu3g0v0r07Qu>


Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM RESCISÃO **jun/24**

Unidade Beneficiada:	TIMBÓ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2018	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	763	Prazo de execução com prorrog.:	30/06/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$16.235.823,18
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.130.214,49	Valor liberado de acréscimos:	R\$984.080,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.104.720,22	Valor descontado (supressões):	R\$1.104.720,22
% de aditivos de acréscimo:	6,56%	% de aditivos de supressão:	6,41%
Valor total final da obra:	R\$17.253.917,55	Valores totais liberados:	R\$16.115.182,96
Valores à liberar:	R\$1.138.734,59	% Executado (sobre o valor final):	93,40%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Paralisada

Situação da Obra:

Obra paralisada. Em procedimentos de rescisão contratual. Fórum inaugurado com serviços complementares através dos contratos de manutenção.

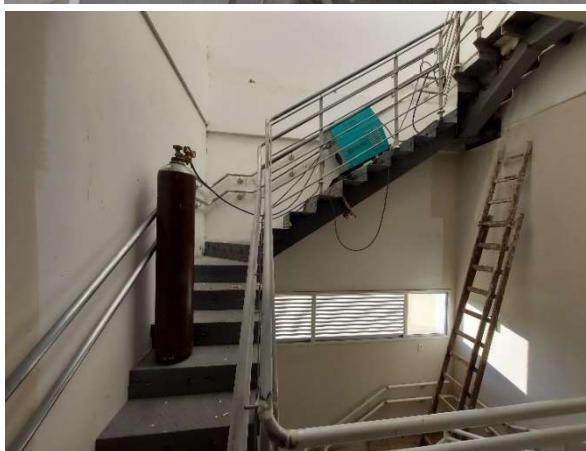

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://piv.tjma.jf.br/bramemrcia/servlet/RepositorioArquivosUteis?acao=visualizarArquivo&idArquivo=38587&idArquivoOriginal=38587&idArquivoOriginal=38587&idArquivoOriginal=38587>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO	jun/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	S. AMARO DA IMPERATRIZ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	031/2023	Estabilização de talude	
Data da Ordem de Serviço:	12/07/2023	Empresa Responsável:	Freedom Eng. e Constr. Ltda.
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	08/01/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	08/01/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.817.542,87	Valor liberado do CFF:	R\$4.316,61
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.817.542,87	Valores totais liberados:	R\$4.316,61
Valores à liberar:	R\$1.813.226,26	% Executado (sobre o valor final):	0,24%
Área construída:	761,25 m ²	Desenvolvimento:	Rescindido.

Situação da Obra:

Contrato rescindido em função de novos deslizamentos que requereram alteração de projeto. SEI 0039602-56.2023.8.24.0710

Contrato para retomada já assinado. Aguardando Ordem de Serviço.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://www.tjsc.jus.br/transparencia/portal/#/consultarlicitacao/detalheslicitacao/rujwY1kmbUj381b6C8YwNc111C8dX8vYV2h8G1N7E1u0eBy0s0f3kWuXNDcmFVW8Q1u1dG1w6161A1C1R3NDcmFMWY1r1p0v1D1u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2023	jun/24
---	---------------

Obras iniciadas: 7
Obras concluídas (TRP): 6
Obras concluídas com TRD: 4
Obras em andamento: 17
Nº de obras no ano: 23

Valores Liberados:	
Janeiro	R\$ 3.407.113,97
Fevereiro	R\$ 3.783.394,96
Março	R\$ 2.719.315,03
Abril	R\$ 4.950.403,84
Maió	R\$ 4.028.791,77
Junho	R\$ 4.888.054,16
Julho	R\$ -
Agosto	R\$ -
Setembro	R\$ -
Outubro	R\$ -
Novembro	R\$ -
Dezembro	R\$ -
Total	R\$ 23.777.073,73



Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras:

<https://nscjudic5.sherpoint.com/Files/TransparenciaObras/Documentos/2020/Compartilhador/Forma/AllItems.aspx?Folder%2FTransparenciaObras%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FDBAS%20EM%20ANDAMENTO&e=true&e=1>

Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Diogo Coelho Rocha

Fábio Rogério Haupenthal

Matheus Erpen Benincá

Wilson Spernau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Arquiteto:

João Marcos Corrêa

Data de atualização: 10/07/2024

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
