


RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		Ref: 05/2019	
Unidade Beneficiada:	TUBARÃO	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	137/2017	Reforma global do prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	04/09/2017	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi
Prazo contratual (dias):	540	Prazo de execução original:	26/02/2019
Prorrogação de prazo (dias):	120	Prazo de execução com prorrog.:	26/06/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$2.958.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$2.700.986,24
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$785.948,69	Valor liberado de acréscimos:	R\$625.695,24
Valor de aditivos de supressões:	R\$110.631,08	Valor descontado (supressões):	R\$110.631,08
% de aditivos de acréscimo:	26,57%	% de aditivos de supressão:	3,74%
Valor total final da obra:	R\$3.633.317,61	Valores totais liberados:	R\$3.216.050,40
Valores à liberar:	R\$417.267,21	% Executado (sobre o valor final):	88,52%
Área construída:	5.213,66 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:

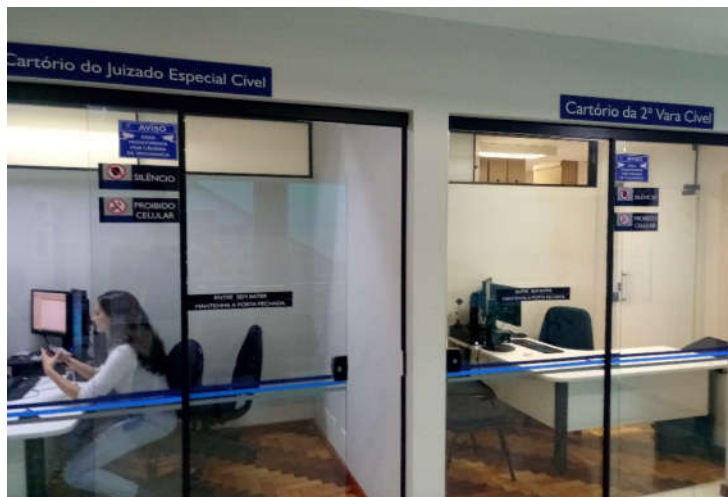

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		Ref: 05/2019	
Unidade Beneficiada:	TIMBÓ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2018	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	28/05/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$3.907.217,02
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$17.228.423,28	Valores totais liberados:	R\$3.907.217,02
Valores à liberar:	R\$13.321.206,26	% Executado (sobre o valor final):	22,68%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		Ref: 05/2019	
Unidade Beneficiada:	RIO DO SUL	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	136/2018	Retomada da construção do novo prédio do Fórum	
Data de Início da Obra:	08/10/2018	Empresa Responsável:	Estrutura Engenharia
Prazo contratual (dias):	660	Prazo de execução original:	29/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	29/07/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$18.876.331,19	Valor liberado do CFF:	R\$2.150.690,46
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$229.957,88	Valor liberado de acréscimos:	R\$175.387,08
Valor de aditivos de supressões:	R\$41.760,59	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	1,22%	% de aditivos de supressão:	0,22%
Valor total final da obra:	R\$19.064.528,48	Valores totais liberados:	R\$2.326.077,54
Valores à liberar:	R\$16.738.450,94	% Executado (sobre o valor final):	12,20%
Área construída:	10.443,73 m ²	Desenvolvimento:	Em dia


Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		Ref: 05/2019	
Unidade Beneficiada:	TJSC - Torre II	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	180/2018	Reforma da Torre II para remoção de brises, etc	
Data da Ordem de Serviço:	20/12/2018	Empresa Responsável:	Gefisa Const Incorpor Ltda
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	19/05/2019
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	18/07/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$862.332,64	Valor liberado do CFF:	R\$146.245,56
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$862.332,64	Valores totais liberados:	R\$146.245,56
Valores à liberar:	R\$716.087,08	% Executado (sobre o valor final):	16,96%
Área construída:	13.100,00 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:

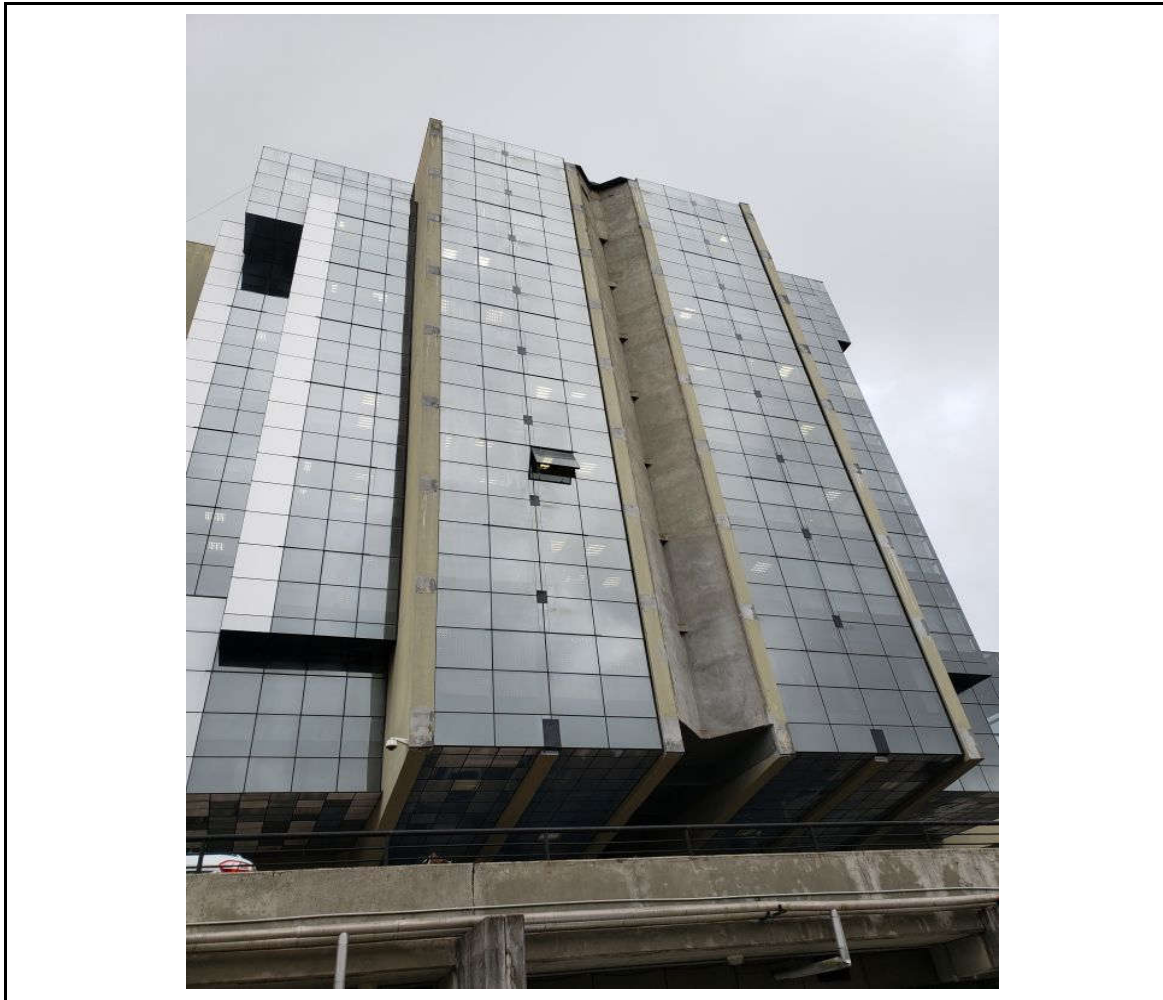

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		Ref: 05/2019	
Unidade Beneficiada:	Blumenau - F. Univer.	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	190/2018	Reforma e Ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	12/12/2018	Empresa Responsável:	Açu Constr. e Incorpor.
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	07/12/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	07/12/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$1.100.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$329.101,19
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.100.000,00	Valores totais liberados:	R\$329.101,19
Valores à liberar:	R\$770.898,81	% Executado (sobre o valor final):	29,92%
Área construída:	2916,00 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		Ref: 05/2019	
Unidade Beneficiada:	Ibirama	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	194/2018	Reforma: contenção de taludes	
Data da Ordem de Serviço:	09/01/2019	Empresa Responsável:	JC Constr. E Pavimentações
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	09/04/2019
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	08/06/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$201.551,84	Valor liberado do CFF:	R\$180.702,04
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$21.947,71	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$3.490,20	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	10,89%	% de aditivos de supressão:	1,73%
Valor total final da obra:	R\$220.009,35	Valores totais liberados:	R\$180.702,04
Valores à liberar:	R\$39.307,31	% Executado (sobre o valor final):	82,13%
Área construída:	1360,37 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	Ref: 05/2019
--	---------------------

Unidade Beneficiada:	Torre I - Torre II	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	196/2018	Reforma das passarelas de ligação	
Data da Ordem de Serviço:	07/01/2019	Empresa Responsável:	Construtora De Angelo
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	06/07/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	06/07/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$628.683,81	Valor liberado do CFF:	R\$84.303,37
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$628.683,81	Valores totais liberados:	R\$84.303,37
Valores à liberar:	R\$544.380,44	% Executado (sobre o valor final):	13,41%
Área construída:	26717,00 m²	Desenvolvimento:	Rescindida

Situação da Obra:

Obra rescindida, visto que a empresa Tecon, responsável pela construção da Torre II assumiu os serviços em função de patologias construtivas encontradas após o início da obra.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		Ref: 05/2019	
Unidade Beneficiada:	Anchieta	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	210/2018	Reforma e ampliação (acessibilidade e cercamento)	
Data da Ordem de Serviço:	29/01/2019	Empresa Responsável:	Tratare Construções
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	26/09/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	26/09/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$672.041,16	Valor liberado do CFF:	R\$109.778,50
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$7.144,37	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	1,06%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$679.185,53	Valores totais liberados:	R\$109.778,50
Valores à liberar:	R\$569.407,03	% Executado (sobre o valor final):	16,16%
Área construída:	392,60 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	Ref: 05/2019
--	---------------------

Unidade Beneficiada:	Indaial	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	54/2019	Ligação da rede de esgoto	
Data da Ordem de Serviço:	21/03/2019	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	30	Prazo de execução original:	20/04/2019
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	19/06/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$43.602,06	Valor liberado do CFF:	R\$16.307,57
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$43.602,06	Valores totais liberados:	R\$16.307,57
Valores à liberar:	R\$27.294,49	% Executado (sobre o valor final):	37,40%
Área construída:	1360,37 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	Ref: 05/2019
--	---------------------

Unidade Beneficiada:	Blumenau	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	55/2019	Reforma global e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	25/04/2019	Empresa Responsável:	Head Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	1200	Prazo de execução original:	07/08/2022
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	07/08/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$13.931.394,83	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$13.931.394,83	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$13.931.394,83	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	10121,23 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	Ref: 05/2019
--	---------------------

Unidade Beneficiada:	Balneário Camboriú	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	76/2019	Construção de muro de contenção e cercamento	
Data da Ordem de Serviço:	24/04/2019	Empresa Responsável:	Formatto Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	21/10/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	21/10/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$680.144,59	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$680.144,59	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$680.144,59	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	5693,66 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	Ref: 05/2019
--	---------------------

Unidade Beneficiada:	Ponte Serrada	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	51/2019	Reforma e ampliação para acessibilidade	
Data da Ordem de Serviço:	25/04/2019	Empresa Responsável:	Lupa Construções Ltda
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	22/10/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	22/10/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$594.252,14	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$594.252,14	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$594.252,14	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	340,00 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		Ref: 05/2019	
Unidade Beneficiada:	NAVEGANTES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	098/2019	Conclusão da obra do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	16/05/2019	Empresa Responsável:	JM Gato Constr. Incorp. Ltda
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	12/11/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	12/11/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$2.160.205,26	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$2.160.205,26	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$2.160.205,26	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento.

Situação da Obra:

O Contrato 098/2019 trata da conclusão da obra de construção do novo Fórum de Navegantes que foi iniciada pela empresa Concretel Construções através do Contrato 060/2014 (rescindido).



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA **Ref: 05/2019**

Unidade Beneficiada:	NAVEGANTES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	060/2014	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	08/05/2014	Empresa Responsável:	Concretel Construções
Prazo contratual (dias):	900	Prazo de execução original:	24/10/2016
Prorrogação de prazo (dias):	343	Prazo de execução com prorrog.:	02/10/2017
Valor do CFF original da obra:	R\$16.324.488,52	Valor liberado do CFF:	R\$15.132.538,91
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.374.367,71	Valor liberado de acréscimos:	R\$1.324.747,06
Valor de aditivos de supressões:	R\$446.134,44	Valor descontado (supressões):	R\$446.134,44
% de aditivos de acréscimo:	8,42%	% de aditivos de supressão:	2,73%
Valor total final da obra:	R\$17.252.721,79	Valores totais liberados:	R\$16.011.151,53
Valores à liberar:	R\$1.241.570,26	% Executado (sobre o valor final):	92,80%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Obra rescindida

Situação da Obra:

A empresa Concretel paralisou a obra por duas vezes sem comunicação prévia ao TJSC.

Em 02/08/2018 foi entregue à empresa Concretel a Ordem de Paralisação emitida pela Presidência do TJSC.

O contrato foi rescindido em 14/01/2019.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	Ref: 05/2019
---	---------------------

Unidade Beneficiada:	Arq. Central - ARIRIÚ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	082/2015	Reforma global do prédio do Arquivo Central - Aririú - Palhoça	
Data da Ordem de Serviço:	30/06/2015	Empresa Responsável:	Concretil Construções
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	24/06/2016
Prorrogação de prazo (dias):	451	Prazo de execução com prorrog.:	18/09/2017
Valor do CFF original da obra:	R\$14.516.133,80	Valor liberado do CFF:	R\$14.516.133,80
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.338.940,99	Valor liberado de acréscimos:	R\$2.338.940,99
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.624.480,32	Valor descontado (supressões):	R\$1.624.480,32
% de aditivos de acréscimo:	16,11%	% de aditivos de supressão:	11,19%
Valor total final da obra:	R\$15.230.594,47	Valores totais liberados:	R\$15.230.594,47
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	8.851,78 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 10/07/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 10/07/2018 e definitivamente em 13/05/2019.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	Ref: 05/2019
---	---------------------

Unidade Beneficiada:	ITAJAÍ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	207/2017	Reforma do prédio do Fórum - escadria e átrio do Salão do Júri	
Data da Ordem de Serviço:	14/02/2018	Empresa Responsável:	Raccio Eng. E Construções
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	15/05/2018
Prorrogação de prazo (dias):	50	Prazo de execução com prorrog.:	04/07/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$218.759,25	Valor liberado do CFF:	R\$218.759,25
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$218.759,25	Valores totais liberados:	R\$218.759,25
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	7.480,84 m²	Desenvolvimento:	Concluída em 30/08/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 30/08/2018 e definitivamente em 03/05/2019.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	Ref: 05/2019
---	---------------------

Unidade Beneficiada:	LAGUNA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	032/2018	Reforma parcial do prédio do Fórum (porta giratória e PPCI)	
Data da Ordem de Serviço:	22/03/2018	Empresa Responsável:	Basecom Const. Civis
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	20/06/2018
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	18/09/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$123.157,43	Valor liberado do CFF:	R\$123.157,43
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.554,51	Valor liberado de acréscimos:	R\$2.554,51
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	2,07%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$125.711,94	Valores totais liberados:	R\$125.711,94
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	3.028,36 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 06/11/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 06/11/2018 e definitivamente em 29/01/2019.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	Ref: 05/2019
--	---------------------

Unidade Beneficiada:	TJSC	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	105/2018	Nova iluminação do estacionamento coberto das Torres I e II	
Data da Ordem de Serviço:	28/08/2018	Empresa Responsável:	Solar Eng. E Projetos
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	26/11/2018
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	26/11/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$66.380,01	Valor liberado do CFF:	R\$66.380,01
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$66.380,01	Valores totais liberados:	R\$66.380,01
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	26.717,00 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 19/11/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 19/11/2018.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	Ref: 05/2019
---	---------------------

Unidade Beneficiada:	ALMOX. CENT. E GRÁF.	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	Empenho 2018NE004703	Instalação do sistema de alarme de intrusão	
Data da Ordem de Serviço:	29/10/2018	Empresa Responsável:	Estratégia IT
Prazo contratual (dias):	45	Prazo de execução original:	13/12/2018
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	13/12/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$57.499,23	Valor liberado do CFF:	R\$57.499,23
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$57.499,23	Valores totais liberados:	R\$57.499,23
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	4.109,52 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 14/11/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 14/11/2018 e definitivamente em 15/02/2019.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	Ref: 05/2019
---	---------------------

Unidade Beneficiada:	JOAÇABA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	059/2018	Reforma parcial (esquadrias)	
Data da Ordem de Serviço:	16/05/2018	Empresa Responsável:	AZ Construções
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	12/11/2018
Prorrogação de prazo (dias):	45	Prazo de execução com prorrog.:	27/12/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$246.908,22	Valor liberado do CFF:	R\$246.908,22
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$28.686,34	Valor liberado de acréscimos:	R\$28.686,34
Valor de aditivos de supressões:	R\$14.207,70	Valor descontado (supressões):	R\$14.207,70
% de aditivos de acréscimo:	11,62%	% de aditivos de supressão:	5,75%
Valor total final da obra:	R\$261.386,86	Valores totais liberados:	R\$261.386,86
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	2.624,08 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 27/12/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 27/12/2018 e definitivamente em 18/05/2019.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA		Ref: 05/2019	
Unidade Beneficiada:	TUUCAS	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	064/2018	Reforma parcial (cercamento e urbanização)	
Data da Ordem de Serviço:	21/05/2018	Empresa Responsável:	Berkana Prest. Serv. e Com.
Prazo contratual (dias):	210	Prazo de execução original:	17/12/2018
Prorrogação de prazo (dias):	75	Prazo de execução com prorrog.:	02/03/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$340.391,93	Valor liberado do CFF:	R\$340.391,93
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$39.164,85	Valor liberado de acréscimos:	R\$39.164,85
Valor de aditivos de supressões:	R\$16.009,99	Valor descontado (supressões):	R\$16.009,99
% de aditivos de acréscimo:	11,51%	% de aditivos de supressão:	4,70%
Valor total final da obra:	R\$363.546,79	Valores totais liberados:	R\$363.546,79
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	924,46 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 28/02/2019

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 28/02/2019 e definitivamente em 27/05/2019.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	Ref: 05/2019
---	---------------------

Unidade Beneficiada:	CHAPECÓ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	158/2018	Ampliação da climatização tipo VRV do prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	31/10/2018	Empresa Responsável:	Termale Eng. E Climatização
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	28/02/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	28/02/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$351.299,09	Valor liberado do CFF:	R\$351.299,09
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$351.299,09	Valores totais liberados:	R\$351.299,09
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	7.737,00 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 28/02/2019

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 28/02/2019 e definitivamente em 21/05/2019.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	Ref: 05/2019
--	---------------------

Unidade Beneficiada:	Joinville - F. Fazendário	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	29/2019	Ligação da rede de esgoto	
Data da Ordem de Serviço:	14/03/2019	Empresa Responsável:	AZ Construções
Prazo contratual (dias):	30	Prazo de execução original:	13/04/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	13/04/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$67.258,14	Valor liberado do CFF:	R\$67.258,14
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$67.258,14	Valores totais liberados:	R\$67.258,14
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	xxx m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 12/04/2019

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 12/04/2019.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2019

Ref: 05/2019

Obras iniciadas:	9
Obras concluídas (TRP):	1
Obras concluídas com TRD:	8
Obras paralisadas/rescindidas:	1
Obras em andamento:	13
Nº de obras no ano:	22

Valores Liberados:	
Janeiro	R\$ 1.078.472,28
Fevereiro	R\$ 1.153.428,32
Março	R\$ 1.343.153,96
Abril	R\$ 1.026.901,50
Maio	R\$ 1.683.668,20
Junho	R\$ -
Julho	R\$ -
Agosto	R\$ -
Setembro	R\$ -
Outubro	R\$ -
Novembro	R\$ -
Dezembro	R\$ -
Total	R\$ 6.285.624,26



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Cristiane Batista Tatavitto

Diogo Coelho Rocha

Herlei José Cantú

Rafael Gonzaga Lima

Wilson Spernau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Data de atualização: 04/06/2019

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
