

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		Ref: 11/2018	
Unidade Beneficiada:	TUBARÃO	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	137/2017	Reforma global do prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	04/09/2017	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi
Prazo contratual (dias):	540	Prazo de execução original:	26/02/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	26/02/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$2.958.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$2.295.253,19
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$432.214,34	Valor liberado de acréscimos:	R\$267.254,85
Valor de aditivos de supressões:	R\$5.370,85	Valor descontado (supressões):	R\$5.370,85
% de aditivos de acréscimo:	14,61%	% de aditivos de supressão:	0,18%
Valor total final da obra:	R\$3.384.843,49	Valores totais liberados:	R\$2.557.137,19
Valores à liberar:	R\$827.706,30	% Executado (sobre o valor final):	75,55%
Área construída:	5.213,66 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		Ref: 11/2018	
Unidade Beneficiada:	TIMBÓ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2018	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	28/05/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$1.452.453,70
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$17.228.423,28	Valores totais liberados:	R\$1.452.453,70
Valores à liberar:	R\$15.775.969,58	% Executado (sobre o valor final):	8,43%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		Ref: 11/2018	
Unidade Beneficiada:	TUUCAS	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	064/2018	Reforma parcial (cercamento e urbanização)	
Data da Ordem de Serviço:	21/05/2018	Empresa Responsável:	Berkana Prest. Serv. e Com.
Prazo contratual (dias):	210	Prazo de execução original:	17/12/2018
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	17/12/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$340.391,93	Valor liberado do CFF:	R\$280.954,66
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$340.391,93	Valores totais liberados:	R\$280.954,66
Valores à liberar:	R\$59.437,27	% Executado (sobre o valor final):	82,54%
Área construída:	924,46 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		Ref: 11/2018	
Unidade Beneficiada:	JOAÇABA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	059/2018	Reforma parcial (esquadrias)	
Data da Ordem de Serviço:	16/05/2018	Empresa Responsável:	AZ Construções
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	12/11/2018
Prorrogação de prazo (dias):	45	Prazo de execução com prorrog.:	27/12/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$246.908,22	Valor liberado do CFF:	R\$188.530,82
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$246.908,22	Valores totais liberados:	R\$188.530,82
Valores à liberar:	R\$58.377,40	% Executado (sobre o valor final):	76,36%
Área construída:	2.624,08 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		Ref: 11/2018	
Unidade Beneficiada:	RIO DO SUL	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	136/2018	Retomada da construção do novo prédio do Fórum	
Data de Início da Obra:	08/10/2018	Empresa Responsável:	Estrutura Engenharia
Prazo contratual (dias):	660	Prazo de execução original:	29/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	29/07/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$18.876.331,19	Valor liberado do CFF:	R\$244.449,80
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$18.876.331,19	Valores totais liberados:	R\$244.449,80
Valores à liberar:	R\$18.631.881,39	% Executado (sobre o valor final):	1,30%
Área construída:	10.443,73 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		Ref: 11/2018	
Unidade Beneficiada:	CHAPECÓ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	158/2018	Ampliação da climatização tipo VRV do prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	31/10/2018	Empresa Responsável:	Termale Eng. E Climatização
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	28/02/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	28/02/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$351.299,09	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$351.299,09	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$351.299,09	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	7.737,00 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA **Ref: 11/2018**

Unidade Beneficiada:	NAVEGANTES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	060/2014	Construção do nono prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	08/05/2014	Empresa Responsável:	Concretil Construções
Prazo contratual (dias):	900	Prazo de execução original:	24/10/2016
Prorrogação de prazo (dias):	343	Prazo de execução com prorrog.:	02/10/2017
Valor do CFF original da obra:	R\$16.324.488,52	Valor liberado do CFF:	R\$15.132.538,91
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.374.367,71	Valor liberado de acréscimos:	R\$1.324.747,06
Valor de aditivos de supressões:	R\$446.134,44	Valor descontado (supressões):	R\$446.134,44
% de aditivos de acréscimo:	8,42%	% de aditivos de supressão:	2,73%
Valor total final da obra:	R\$17.252.721,79	Valores totais liberados:	R\$16.011.151,53
Valores à liberar:	R\$1.241.570,26	% Executado (sobre o valor final):	92,80%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Em rescisão

Situação da Obra:

A empresa Concretil paralisou a obra por duas vezes sem comunicação prévia ao TJSC.

Em 02/08/2018 foi entregue à empresa Concretil a Ordem de Paralisação emitida pela Presidência do TJSC.

O contrato está em fase de rescisão que tramita no PA 30027/2017.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA EM 2018	Ref: 11/2018
---	---------------------

Unidade Beneficiada:	ARQUIVO CENTRAL - ARIRIÚ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	082/2015	Reforma global do prédio do Arquivo Central - Aririú - Palhoça	
Data da Ordem de Serviço:	30/06/2015	Empresa Responsável:	Concretel Construções
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	24/06/2016
Prorrogação de prazo (dias):	451	Prazo de execução com prorrog.:	18/09/2017
Valor do CFF original da obra:	R\$14.516.133,80	Valor liberado do CFF:	R\$14.516.133,80
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.338.940,99	Valor liberado de acréscimos:	R\$2.338.940,99
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.624.480,32	Valor descontado (supressões):	R\$1.624.480,32
% de aditivos de acréscimo:	16,11%	% de aditivos de supressão:	11,19%
Valor total final da obra:	R\$15.230.594,47	Valores totais liberados:	R\$15.230.594,47
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	8.851,78 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 10/07/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 10/07/2018.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA EM 2018	Ref: 11/2018
---	---------------------

Unidade Beneficiada:	LAGUNA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	034/2018	Manutenção da cobertura do prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	22/03/2018	Empresa Responsável:	Basecom Const. Cívica
Prazo contratual (dias):	75	Prazo de execução original:	05/06/2018
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	04/08/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$72.411,34	Valor liberado do CFF:	R\$72.411,34
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$4.902,88	Valor liberado de acréscimos:	R\$4.902,88
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	6,77%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$77.314,22	Valores totais liberados:	R\$77.314,22
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	3.028,36 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 31/07/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 31/07/2018 e definitivamente em 23/10/2018



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA EM 2018	Ref: 11/2018
---	---------------------

Unidade Beneficiada:	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	048/2018	Reforma parcial - sistema de iluminação de emergência	
Data da Ordem de Serviço:	08/05/2018	Empresa Responsável:	Intelvoice Tecnologia
Prazo contratual (dias):	60	Prazo de execução original:	07/07/2018
Prorrogação de prazo (dias):	15	Prazo de execução com prorrog.:	22/07/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$87.829,71	Valor liberado do CFF:	R\$87.829,71
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$87.829,71	Valores totais liberados:	R\$87.829,71
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	5.693,66 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 22/07/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 22/07/2018 e definitivamente em 16/10/2018.




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização, podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA EM 2018	Ref: 11/2018
---	---------------------

Unidade Beneficiada:	CAPITAL - RID SILVA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	004/2018	Instalação de redes horizontais de proteção.	
Data da Ordem de Serviço:	15/02/2018	Empresa Responsável:	Marcos Roberto O. Lima
Prazo contratual (dias):	45	Prazo de execução original:	01/04/2018
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	01/04/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$28.500,25	Valor liberado do CFF:	R\$28.500,25
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$28.500,25	Valores totais liberados:	R\$28.500,25
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	10.209,34 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 28/03/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 28/03/2018 e definitivamente em 26/06/2018.

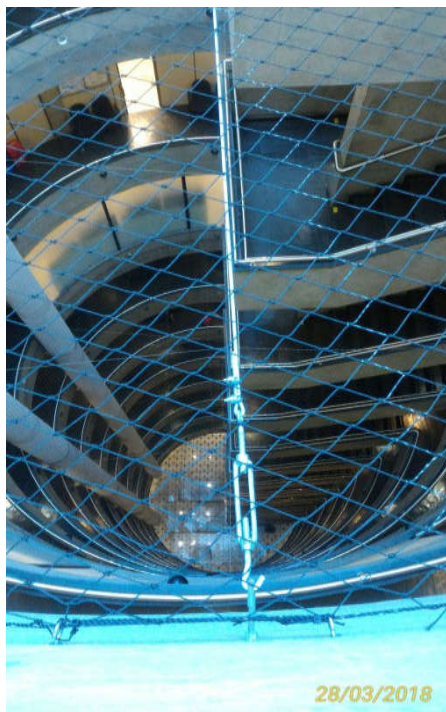

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA EM 2018	Ref: 11/2018
---	---------------------

Unidade Beneficiada:	ITAJAÍ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	207/2017	Reforma do prédio do Fórum - escadria e átrio do Salão do Júri	
Data da Ordem de Serviço:	14/02/2018	Empresa Responsável:	Raccio Eng. E Construções
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	15/05/2018
Prorrogação de prazo (dias):	50	Prazo de execução com prorrog.:	04/07/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$218.759,25	Valor liberado do CFF:	R\$218.759,25
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$218.759,25	Valores totais liberados:	R\$218.759,25
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	7.480,84 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 30/08/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 30/08/2018.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA EM 2018	Ref: 11/2018
---	---------------------

Unidade Beneficiada:	TJSC - TORRE I	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	023/2016	Reforma Global do 5º, 5ª e 6º pavimentos da TORRE I do TJSC	
Data da Ordem de Serviço:	12/04/2016	Empresa Responsável:	Termsul
Prazo contratual (dias):	540	Prazo de execução original:	04/10/2017
Prorrogação de prazo (dias):	270	Prazo de execução com prorrog.:	01/07/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$3.942.960,12	Valor liberado do CFF:	R\$3.942.960,12
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.128.663,76	Valor liberado de acréscimos:	R\$1.128.663,76
Valor de aditivos de supressões:	R\$962.889,87	Valor descontado (supressões):	R\$962.889,87
% de aditivos de acréscimo:	28,62%	% de aditivos de supressão:	24,42%
Valor total final da obra:	R\$4.108.734,01	Valores totais liberados:	R\$4.108.734,01
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	13.617,00 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 30/07/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 30/07/2018 e definitivamente em 19/11/2018.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA EM 2018	Ref: 11/2018
---	---------------------

Unidade Beneficiada:	LAGUNA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	032/2018	Reforma parcial do prédio do Fórum (porta giratória e PPCI)	
Data da Ordem de Serviço:	22/03/2018	Empresa Responsável:	Basecom Const. Civis
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	20/06/2018
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	18/09/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$123.157,43	Valor liberado do CFF:	R\$123.157,43
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.554,51	Valor liberado de acréscimos:	R\$2.554,51
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	2,07%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$125.711,94	Valores totais liberados:	R\$125.711,94
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	3.028,36 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 06/11/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 06/11/2018.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA EM 2018	Ref: 11/2018
---	---------------------

Unidade Beneficiada:	TJSC	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	105/2018	Nova iluminação do estacionamento coberto das Torres I e II	
Data da Ordem de Serviço:	28/08/2018	Empresa Responsável:	Solar Eng. E Projetos
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	26/11/2018
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	26/11/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$66.380,01	Valor liberado do CFF:	R\$66.380,01
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$66.380,01	Valores totais liberados:	R\$66.380,01
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	26.717,00 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 19/11/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 19/11/2018.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA EM 2018	Ref: 11/2018
---	---------------------

Unidade Beneficiada:	ALMOX. CENTRAL E GRÁFICA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	Empenho 2018NE004703	Instalação do sistema de alarme de intrusão	
Data da Ordem de Serviço:	29/10/2018	Empresa Responsável:	Estratégia IT
Prazo contratual (dias):	45	Prazo de execução original:	13/12/2018
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	13/12/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$57.499,23	Valor liberado do CFF:	R\$57.499,23
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$57.499,23	Valores totais liberados:	R\$57.499,23
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	4.109,52 m²	Desenvolvimento:	Concluída em 14/11/2018

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 14/11/2018.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2018	Ref: 11/2018
---	---------------------

Obras iniciadas: 12
 Obras concluídas: 9
 Obras paralisadas/rescindidas: 1
 Obras em andamento: 6
 Nº de obras no ano: 16

Valores Liberados:	
Janeiro	R\$ 463.472,85
Fevereiro	R\$ 465.767,97
Março	R\$ 592.269,35
Abril	R\$ 615.354,62
Maiο	R\$ 421.014,16
Junho	R\$ 888.329,75
Julho	R\$ 1.215.305,83
Agosto	R\$ 699.689,27
Setembro	R\$ 501.921,23
Outubro	R\$ 578.494,52
Novembro	R\$ 1.095.565,54
Dezembro	R\$ -
Total	R\$ 7.537.185,09



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Cristiane Batista Tatavitto

Diogo Coelho Rocha

Herlei José Cantú

Sérgio Machado

Wilson Spernau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Data de atualização: 11/12/2018

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
