

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | | fev/20 | |
|---|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Unidade Beneficiada: | TIMBÓ | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 050/2018 | Construção do novo prédio do Fórum | |
| Data da Ordem de Serviço: | 13/06/2018 | Empresa Responsável: | Endeal Eng e Construções |
| Prazo contratual (dias): | 1080 | Prazo de execução original: | 28/05/2021 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 28/05/2021 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$17.228.423,28 | Valor liberado do CFF: | R\$6.771.746,08 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$17.228.423,28 | Valores totais liberados: | R\$6.771.746,08 |
| Valores à liberar: | R\$10.456.677,20 | % Executado (sobre o valor final): | 39,31% |
| Área construída: | 6.857,59 m ² | Desenvolvimento: | Em atraso. |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | | fev/20 | |
|---|--------------------------|--|----------------------|
| Unidade Beneficiada: | RIO DO SUL | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 136/2018 | Retomada da construção do novo prédio do Fórum | |
| Data de Início da Obra: | 08/10/2018 | Empresa Responsável: | Estrutura Engenharia |
| Prazo contratual (dias): | 660 | Prazo de execução original: | 29/07/2020 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrogação: | 29/07/2020 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$18.876.331,19 | Valor liberado do CFF: | R\$10.282.661,60 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$1.005.233,37 | Valor liberado de acréscimos: | R\$972.961,89 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$635.252,90 | Valor descontado (supressões): | R\$496.553,47 |
| % de aditivos de acréscimo: | 5,33% | % de aditivos de supressão: | 3,37% |
| Valor total final da obra: | R\$19.246.311,66 | Valores totais liberados: | R\$10.759.070,02 |
| Valores à liberar: | R\$8.487.241,64 | % Executado (sobre o valor final): | 55,90% |
| Área construída: | 10.443,73 m ² | Desenvolvimento: | Em dia. |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | | fev/20 | |
|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Beneficiada: | BLUMENAU - F. UNIVER. | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 190/2018 | Reforma e Ampliação | |
| Data da Ordem de Serviço: | 12/12/2018 | Empresa Responsável: | Açu Constr. e Incorpor. |
| Prazo contratual (dias): | 360 | Prazo de execução original: | 07/12/2019 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 120 | Prazo de execução com prorrog.: | 05/04/2020 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$1.100.000,00 | Valor liberado do CFF: | R\$1.090.739,63 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$182.538,10 | Valor liberado de acréscimos: | R\$178.166,34 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$21.552,45 | Valor descontado (supressões): | R\$21.552,45 |
| % de aditivos de acréscimo: | 16,59% | % de aditivos de supressão: | 1,96% |
| Valor total final da obra: | R\$1.260.985,65 | Valores totais liberados: | R\$1.247.353,52 |
| Valores à liberar: | R\$13.632,13 | % Executado (sobre o valor final): | 98,92% |
| Área construída: | 2916,00 m ² | Desenvolvimento: | Em dia. |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | | | fev/20 | |
|---|-----------------------|---|---------------------|--|
| Unidade Beneficiada: | ANCHIETA | Tipo de Obra: | | |
| Contrato nº: | 210/2018 | Reforma e ampliação (acessibilidade e cercamento) | | |
| Data da Ordem de Serviço: | 29/01/2019 | Empresa Responsável: | Tratare Construções | |
| Prazo contratual (dias): | 240 | Prazo de execução original: | 26/09/2019 | |
| Prorrogação de prazo (dias): | 178 | Prazo de execução com prorrog.: | 22/03/2020 | |
| Valor do CFF original da obra: | R\$672.041,16 | Valor liberado do CFF: | R\$566.342,62 | |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$100.723,47 | Valor liberado de acréscimos: | R\$99.957,78 | |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$85.082,41 | Valor descontado (supressões): | R\$4.849,05 | |
| % de aditivos de acréscimo: | 14,99% | % de aditivos de supressão: | 12,66% | |
| Valor total final da obra: | R\$687.682,22 | Valores totais liberados: | R\$661.451,35 | |
| Valores à liberar: | R\$26.230,87 | % Executado (sobre o valor final): | 96,19% | |
| Área construída: | 392,60 m ² | Desenvolvimento: | Em dia. | |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | | fev/20 | |
|---|------------------|------------------------------------|----------------------|
| Unidade Beneficiada: | BLUMENAU | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 55/2019 | Reforma global e ampliação | |
| Data da Ordem de Serviço: | 25/04/2019 | Empresa Responsável: | Head Engenharia Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 1200 | Prazo de execução original: | 07/08/2022 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 07/08/2022 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$13.931.394,83 | Valor liberado do CFF: | R\$943.270,58 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$90.859,76 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$20.130,85 | Valor descontado (supressões): | R\$3.246,74 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,65% | % de aditivos de supressão: | 0,14% |
| Valor total final da obra: | R\$14.002.123,74 | Valores totais liberados: | R\$940.023,84 |
| Valores à liberar: | R\$13.062.099,90 | % Executado (sobre o valor final): | 6,71% |
| Área construída: | 10121,23 m² | Desenvolvimento: | Em atraso. |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | fev/20 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Unidade Beneficiada: | PONTE SERRADA | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 51/2019 | Reforma e ampliação para acessibilidade | |
| Data da Ordem de Serviço: | 25/04/2019 | Empresa Responsável: | Lupa Construções Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 180 | Prazo de execução original: | 22/10/2019 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 90 | Prazo de execução com prorrog.: | 20/01/2020 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$594.252,14 | Valor liberado do CFF: | R\$553.904,93 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$64.104,40 | Valor liberado de acréscimos: | R\$64.104,40 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$33.173,83 | Valor descontado (supressões): | R\$33.173,83 |
| % de aditivos de acréscimo: | 10,79% | % de aditivos de supressão: | 5,58% |
| Valor total final da obra: | R\$625.182,71 | Valores totais liberados: | R\$584.835,50 |
| Valores à liberar: | R\$40.347,21 | % Executado (sobre o valor final): | 93,55% |
| Área construída: | 340,00 m ² | Desenvolvimento: | Em atraso. |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | fev/20 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|
| Unidade Beneficiada: | CANOINHAS | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 105/2019 | Complementação do sistema de calefação | |
| Data da Ordem de Serviço: | 05/07/2019 | Empresa Responsável: | Giacomet Termo Metalúrgica |
| Prazo contratual (dias): | 180 | Prazo de execução original: | 01/01/2020 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 90 | Prazo de execução com prorrog.: | 31/03/2020 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$721.943,23 | Valor liberado do CFF: | R\$480.259,42 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$87.676,83 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 12,14% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$809.620,06 | Valores totais liberados: | R\$480.259,42 |
| Valores à liberar: | R\$329.360,64 | % Executado (sobre o valor final): | 59,32% |
| Área construída: | 7.549,47 m ² | Desenvolvimento: | Em dia. |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | | | fev/20 |
|---|-------------------------|---|----------------------|
| Unidade Beneficiada: | CRICIÚMA | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 110/2019 | Reforma para adequação do preventivo contra incêndios | |
| Data da Ordem de Serviço: | 02/07/2019 | Empresa Responsável: | Viadupla Construções |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 30/10/2019 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 30/10/2019 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$574.735,82 | Valor liberado do CFF: | R\$230.836,38 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$574.735,82 | Valores totais liberados: | R\$230.836,38 |
| Valores à liberar: | R\$343.899,44 | % Executado (sobre o valor final): | 40,16% |
| Área construída: | 7.480,84 m ² | Desenvolvimento: | Em atraso. |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | fev/20 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---|--------------------------|
| Unidade Beneficiada: | ITUPORANGA | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 118/2019 | Reforma para adequação do preventivo contra incêndios | |
| Data da Ordem de Serviço: | 10/07/2019 | Empresa Responsável: | Projepower Constr. Empr. |
| Prazo contratual (dias): | 60 | Prazo de execução original: | 08/09/2019 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 08/09/2019 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$74.431,77 | Valor liberado do CFF: | R\$74.431,77 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$4.335,85 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 5,83% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$78.767,62 | Valores totais liberados: | R\$74.431,77 |
| Valores à liberar: | R\$4.335,85 | % Executado (sobre o valor final): | 94,50% |
| Área construída: | 809,91 m ² | Desenvolvimento: | Em atraso. |

Situação da Obra: Existe aditivo de serviços em tramitação




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | fev/20 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|
| Unidade Beneficiada: | ITAJAÍ | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 115/2019 | Fornecimento e instalação de novos elevadores | |
| Data da Ordem de Serviço: | 29/07/2019 | Empresa Responsável: | Systec Serv. Man. Elev. Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 360 | Prazo de execução original: | 23/07/2020 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 23/07/2020 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$477.738,65 | Valor liberado do CFF: | R\$174.457,39 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$477.738,65 | Valores totais liberados: | R\$174.457,39 |
| Valores à liberar: | R\$303.281,26 | % Executado (sobre o valor final): | 36,52% |
| Área construída: | 7.480,84 m ² | Desenvolvimento: | Em dia. |

Situação da Obra:

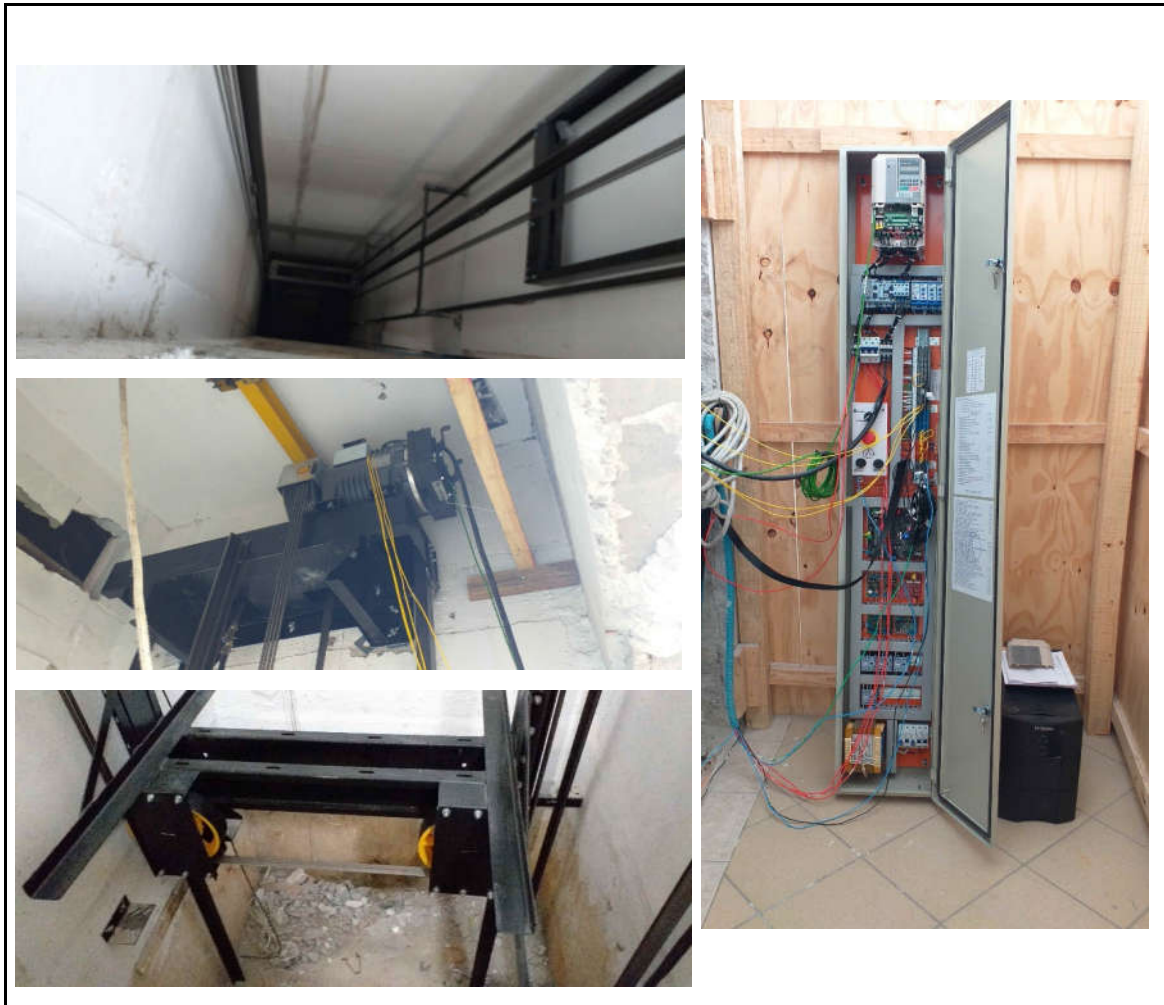

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | fev/20 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Unidade Beneficiada: | INDAIAL | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 145/2019 | Reforma da cobertura | |
| Data da Ordem de Serviço: | 11/09/2019 | Empresa Responsável: | Bortolon Arq. E Incorp. Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 09/01/2020 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 30 | Prazo de execução com prorrog.: | 08/02/2020 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$286.883,22 | Valor liberado do CFF: | R\$244.449,09 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$26.682,54 | Valor liberado de acréscimos: | R\$26.682,54 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$23.490,68 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 9,30% | % de aditivos de supressão: | 8,19% |
| Valor total final da obra: | R\$290.075,08 | Valores totais liberados: | R\$271.131,63 |
| Valores à liberar: | R\$18.943,45 | % Executado (sobre o valor final): | 93,47% |
| Área construída: | 1.370,67 m ² | Desenvolvimento: | Em dia |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | fev/20 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Unidade Beneficiada: | IMBITUBA | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 131/2019 | Construção do novo prédio do Fórum | |
| Data da Ordem de Serviço: | 17/10/2019 | Empresa Responsável: | Head Engenharia Ltda EPP |
| Prazo contratual (dias): | 1080 | Prazo de execução original: | 01/10/2022 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 01/10/2022 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$21.598.789,41 | Valor liberado do CFF: | R\$447.260,24 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$21.598.789,41 | Valores totais liberados: | R\$447.260,24 |
| Valores à liberar: | R\$21.151.529,17 | % Executado (sobre o valor final): | 2,07% |
| Área construída: | 6.857,59 m ² | Desenvolvimento: | Em atraso. |

Situação da Obra:




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | fev/20 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Unidade Beneficiada: | IBIRAMA | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 169/2019 | Reforma da cobertura | |
| Data da Ordem de Serviço: | 18/11/2019 | Empresa Responsável: | SCHAFFER & PIAZZA |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 17/03/2020 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 17/03/2020 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$334.932,79 | Valor liberado do CFF: | R\$143.148,96 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$334.932,79 | Valores totais liberados: | R\$143.148,96 |
| Valores à liberar: | R\$191.783,83 | % Executado (sobre o valor final): | 42,74% |
| Área construída: | 1360,37 m ² | Desenvolvimento: | Em atraso. |

Situação da Obra:

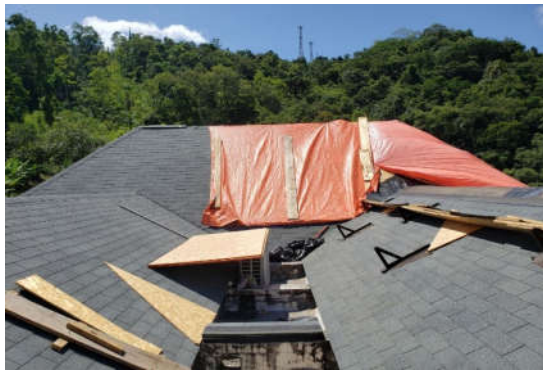

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | | | fev/20 |
|---|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Unidade Beneficiada: | SEARA | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 142/2019 | Reforma parcial | |
| Data da Ordem de Serviço: | 03/12/2019 | Empresa Responsável: | Lupa Construções Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 240 | Prazo de execução original: | 30/07/2020 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 30/07/2020 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$859.714,26 | Valor liberado do CFF: | R\$202.772,72 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$859.714,26 | Valores totais liberados: | R\$202.772,72 |
| Valores à liberar: | R\$656.941,54 | % Executado (sobre o valor final): | 23,59% |
| Área construída: | 1016,84 m ² | Desenvolvimento: | Em atraso. |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | fev/20 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Unidade Beneficiada: | CAPITAL - RID SILVA | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 147/2019 | Instalação de plataforma elevatória | |
| Data da Ordem de Serviço: | 09/12/2019 | Empresa Responsável: | Lupa Construções Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 150 | Prazo de execução original: | 07/05/2020 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 07/05/2020 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$100.093,58 | Valor liberado do CFF: | R\$47.995,33 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$100.093,58 | Valores totais liberados: | R\$47.995,33 |
| Valores à liberar: | R\$52.098,25 | % Executado (sobre o valor final): | 47,95% |
| Área construída: | 1016,84 m ² | Desenvolvimento: | Em dia. |


Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | | fev/20 | |
|---|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Beneficiada: | CAÇADOR | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 183/2019 | Instalação de rede de fibra ótica | |
| Data da Ordem de Serviço: | 07/01/2020 | Empresa Responsável: | Integrasul T. Inf. E Com. Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 90 | Prazo de execução original: | 06/04/2020 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 06/04/2020 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$393.214,86 | Valor liberado do CFF: | R\$96.599,67 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$393.214,86 | Valores totais liberados: | R\$96.599,67 |
| Valores à liberar: | R\$296.615,19 | % Executado (sobre o valor final): | 24,57% |
| Área construída: | 1624,48 m ² | Desenvolvimento: | Em dia. |

Situação da Obra:

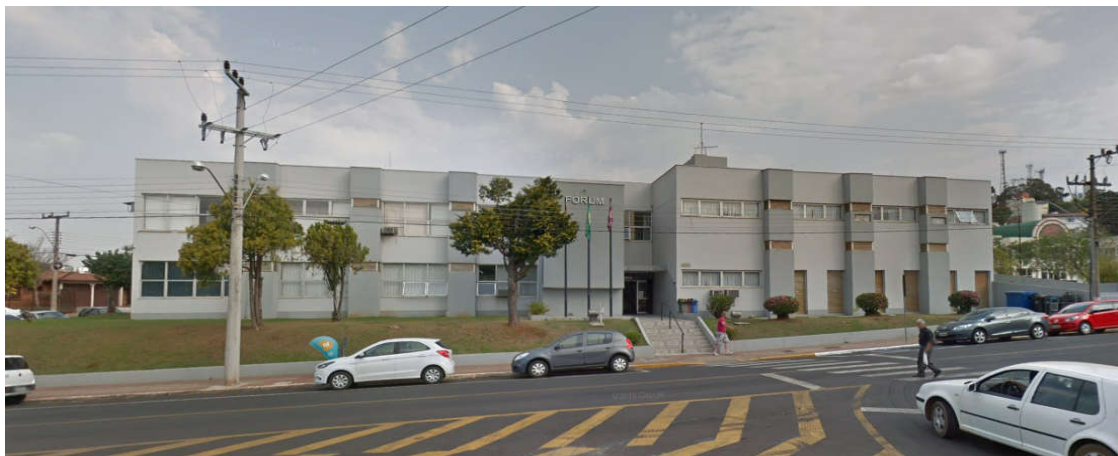

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | | fev/20 | |
|---|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Beneficiada: | URUBICI | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 188/2019 | Reforma da cobertura | |
| Data da Ordem de Serviço: | 17/01/2020 | Empresa Responsável: | Strehl Sol. em Engenharia |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 16/05/2020 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 16/05/2020 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$317.747,13 | Valor liberado do CFF: | R\$47.485,06 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$317.747,13 | Valores totais liberados: | R\$47.485,06 |
| Valores à liberar: | R\$270.262,07 | % Executado (sobre o valor final): | 14,94% |
| Área construída: | 724,98 m ² | Desenvolvimento: | Em dia. |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | fev/20 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Beneficiada: | TUBARÃO | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 211/2019 | Reforma da cobertura | |
| Data da Ordem de Serviço: | 27/01/2020 | Empresa Responsável: | Termsul Eng. e Serv. Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 90 | Prazo de execução original: | 26/04/2020 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 26/04/2020 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$423.327,53 | Valor liberado do CFF: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$423.327,53 | Valores totais liberados: | R\$0,00 |
| Valores à liberar: | R\$423.327,53 | % Executado (sobre o valor final): | 0,00% |
| Área construída: | 5213,69 m ² | Desenvolvimento: | Em dia. |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD | fev/20 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|
| Unidade Beneficiada: | TJSC - Torre II | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 180/2018 | Reforma da Torre II para remoção de brises, etc | |
| Data da Ordem de Serviço: | 20/12/2018 | Empresa Responsável: | Gefisa Const Incorpor Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 150 | Prazo de execução original: | 19/05/2019 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 120 | Prazo de execução com prorrog.: | 16/09/2019 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$862.332,64 | Valor liberado do CFF: | R\$862.332,64 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$862.332,64 | Valores totais liberados: | R\$862.332,64 |
| Valores à liberar: | R\$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |
| Área construída: | 13.100,00 m ² | Desenvolvimento: | Concluída em 28/10/2019 |

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 28/10/2019



Fiscalização com auxílio de profissionais da DMTJ


Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD **fev/20**

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| Unidade Beneficiada: | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 76/2019 | Construção de muro de contenção e cercamento | |
| Data da Ordem de Serviço: | 24/04/2019 | Empresa Responsável: | Formatto Engenharia Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 180 | Prazo de execução original: | 21/10/2019 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 60 | Prazo de execução com prorrog.: | 20/12/2019 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$680.144,59 | Valor liberado do CFF: | R\$680.144,59 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$7.968,28 | Valor liberado de acréscimos: | R\$7.968,28 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$5.946,33 | Valor descontado (supressões): | R\$5.946,33 |
| % de aditivos de acréscimo: | 1,17% | % de aditivos de supressão: | 0,87% |
| Valor total final da obra: | R\$682.166,54 | Valores totais liberados: | R\$682.166,54 |
| Valores à liberar: | R\$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |
| Área construída: | 5693,66 m ² | Desenvolvimento: | Concluída em 02/12/2019 |

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 02/12/2019.

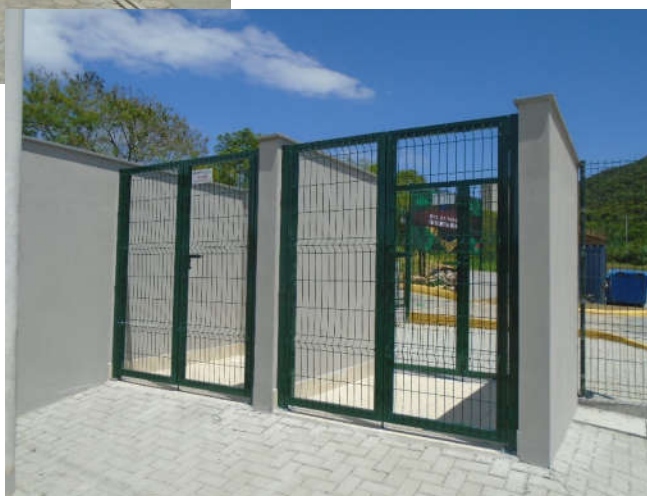

Fiscalização com auxílio de profissionais da DPRO

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD | fev/20 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| Unidade Beneficiada: | CONCÓRDIA | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 160/2018 | Reforma dos brises da fachada da edificação | |
| Data da Ordem de Serviço: | 24/07/2019 | Empresa Responsável: | AZ Construções |
| Prazo contratual (dias): | 150 | Prazo de execução original: | 21/12/2019 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 21/12/2019 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$276.770,81 | Valor liberado do CFF: | R\$276.770,81 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$132.938,43 | Valor liberado de acréscimos: | R\$132.938,43 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$33.806,83 | Valor descontado (supressões): | R\$33.806,83 |
| % de aditivos de acréscimo: | 48,03% | % de aditivos de supressão: | 12,21% |
| Valor total final da obra: | R\$375.902,41 | Valores totais liberados: | R\$375.902,41 |
| Valores à liberar: | R\$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |
| Área construída: | 5.363,53 m ² | Desenvolvimento: | Concluída em 15/01/2020 |

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 15/01/2020



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD | fev/20 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Beneficiada: | FRAIBURGO | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 111/2019 | Reforma da cobertura | |
| Data da Ordem de Serviço: | 11/07/2019 | Empresa Responsável: | Strehl Sol. em Engenharia |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 08/11/2019 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 120 | Prazo de execução com prorrog.: | 07/03/2020 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$376.739,26 | Valor liberado do CFF: | R\$376.739,26 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$60.455,81 | Valor liberado de acréscimos: | R\$60.455,81 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 16,05% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$437.195,07 | Valores totais liberados: | R\$437.195,07 |
| Valores à liberar: | R\$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |
| Área construída: | 1.421,32 m ² | Desenvolvimento: | Concluída em 06/02/2020 |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|---|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2019 | fev/20 |
|---|---------------|

Obras iniciadas: 3
 Obras concluídas (TRP): 4
 Obras concluídas com TRD: 0
 Obras paralisadas/rescindidas: 0
 Obras em andamento: 19
 Nº de obras no ano: 23

| Valores Liberados: | |
|--------------------|-------------------------|
| Janeiro | R\$ 1.842.739,69 |
| Fevereiro | R\$ 1.735.246,62 |
| Março | R\$ - |
| Abril | R\$ - |
| Maio | R\$ - |
| Junho | R\$ - |
| Julho | R\$ - |
| Agosto | R\$ - |
| Setembro | R\$ - |
| Outubro | R\$ - |
| Novembro | R\$ - |
| Dezembro | R\$ - |
| Total | R\$ 3.577.986,31 |



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Cristiane Batista Tatavitto

Diogo Coelho Rocha

Herlei José Cantú

Rafael Gonzaga Lima

Wilson Spernau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albiéri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Data de atualização: 06/03/2020

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
