

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		mai/20	
Unidade Beneficiada:	<b>TIMBÓ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>050/2018</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	28/05/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$7.545.032,87
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$157.059,61	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$165.713,66	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,91%	% de aditivos de supressão:	0,96%
Valor total final da obra:	R\$17.219.769,23	Valores totais liberados:	R\$7.545.032,87
Valores à liberar:	R\$9.674.736,36	% Executado (sobre o valor final):	43,82%
Área construída:	6.857,59 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		mai/20	
Unidade Beneficiada:	<b>RIO DO SUL</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>136/2018</b>	Retomada da construção do novo prédio do Fórum	
Data de Início da Obra:	08/10/2018	Empresa Responsável:	Estrutura Engenharia
Prazo contratual (dias):	660	Prazo de execução original:	29/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	29/07/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$18.876.331,19	Valor liberado do CFF:	R\$13.565.048,07
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$3.324.560,32	Valor liberado de acréscimos:	R\$1.954.686,25
Valor de aditivos de supressões:	R\$2.707.312,81	Valor descontado (supressões):	R\$2.037.120,09
% de aditivos de acréscimo:	17,61%	% de aditivos de supressão:	14,34%
Valor total final da obra:	R\$19.493.578,70	Valores totais liberados:	R\$13.482.614,23
Valores à liberar:	R\$6.010.964,47	% Executado (sobre o valor final):	69,16%
Área construída:	10.443,73 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		mai/20	
Unidade Beneficiada:	<b>ANCHIETA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>210/2018</b>	Reforma e ampliação (acessibilidade e cercamento)	
Data da Ordem de Serviço:	29/01/2019	Empresa Responsável:	Tratare Construções
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	26/09/2019
Prorrogação de prazo (dias):	178	Prazo de execução com prorrog.:	22/03/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$672.041,16	Valor liberado do CFF:	R\$569.902,96
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$100.723,47	Valor liberado de acréscimos:	R\$99.957,78
Valor de aditivos de supressões:	R\$85.082,41	Valor descontado (supressões):	R\$5.865,51
% de aditivos de acréscimo:	14,99%	% de aditivos de supressão:	12,66%
Valor total final da obra:	R\$687.682,22	Valores totais liberados:	R\$663.995,23
Valores à liberar:	R\$23.686,99	% Executado (sobre o valor final):	96,56%
Área construída:	392,60 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>mai/20</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>BLUMENAU</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>55/2019</b>	Reforma global e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	25/04/2019	Empresa Responsável:	Head Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	1200	Prazo de execução original:	07/08/2022
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	07/08/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$13.931.394,83	Valor liberado do CFF:	R\$1.257.938,31
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$191.167,43	Valor liberado de acréscimos:	R\$64.421,20
Valor de aditivos de supressões:	R\$74.761,33	Valor descontado (supressões):	R\$3.246,74
% de aditivos de acréscimo:	1,37%	% de aditivos de supressão:	0,54%
Valor total final da obra:	R\$14.047.800,93	Valores totais liberados:	R\$1.319.112,77
Valores à liberar:	R\$12.728.688,16	% Executado (sobre o valor final):	9,39%
Área construída:	10121,23 m²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>mai/20</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CANOINHAS</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>105/2019</b>	Complementação do sistema de calefação	
Data da Ordem de Serviço:	05/07/2019	Empresa Responsável:	Giacomet Termo Metalúrgica
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	01/01/2020
Prorrogação de prazo (dias):	180	Prazo de execução com prorrog.:	29/06/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$721.943,23	Valor liberado do CFF:	R\$637.987,19
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$87.676,83	Valor liberado de acréscimos:	R\$87.676,83
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	12,14%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$809.620,06	Valores totais liberados:	R\$725.664,02
Valores à liberar:	R\$83.956,04	% Executado (sobre o valor final):	89,63%
Área construída:	7.549,47 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			mai/20
Unidade Beneficiada:	<b>CRICIÚMA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>110/2019</b>	Reforma para adequação do preventivo contra incêndios	
Data da Ordem de Serviço:	02/07/2019	Empresa Responsável:	Viadupla Construções
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	30/10/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	30/10/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$574.735,82	Valor liberado do CFF:	R\$464.360,16
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$574.735,82	Valores totais liberados:	R\$464.360,16
Valores à liberar:	R\$110.375,66	% Executado (sobre o valor final):	80,80%
Área construída:	7.480,84 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>mai/20</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>ITUPORANGA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>118/2019</b>	Reforma para adequação do preventivo contra incêndios	
Data da Ordem de Serviço:	10/07/2019	Empresa Responsável:	Projepower Constr. Empr.
Prazo contratual (dias):	60	Prazo de execução original:	08/09/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	08/09/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$74.431,77	Valor liberado do CFF:	R\$74.431,77
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$4.335,85	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	5,83%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$78.767,62	Valores totais liberados:	R\$74.431,77
Valores à liberar:	R\$4.335,85	% Executado (sobre o valor final):	94,50%
Área construída:	809,91 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra: Aguardando vistoria do CBMSC



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>mai/20</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>ITAJAÍ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>115/2019</b>	Fornecimento e instalação de novos elevadores	
Data da Ordem de Serviço:	29/07/2019	Empresa Responsável:	Systec Serv. Man. Elev. Ltda
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	23/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	23/07/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$477.738,65	Valor liberado do CFF:	R\$210.054,78
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$477.738,65	Valores totais liberados:	R\$210.054,78
Valores à liberar:	R\$267.683,87	% Executado (sobre o valor final):	43,97%
Área construída:	7.480,84 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	<b>Em atraso</b>

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.



<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>mai/20</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>IMBITUBA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>131/2019</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	17/10/2019	Empresa Responsável:	Head Engenharia Ltda EPP
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	01/10/2022
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	01/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$21.598.789,41	Valor liberado do CFF:	R\$813.093,79
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$21.598.789,41	Valores totais liberados:	R\$813.093,79
Valores à liberar:	R\$20.785.695,62	% Executado (sobre o valor final):	3,76%
Área construída:	6.857,59 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>mai/20</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>IBIRAMA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>169/2019</b>	Reforma da cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	18/11/2019	Empresa Responsável:	SCHAFFER & PIAZZA
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	17/03/2020
Prorrogação de prazo (dias):	75	Prazo de execução com prorrog.:	31/05/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$334.932,79	Valor liberado do CFF:	R\$264.449,01
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$3.703,99	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$18.108,38	Valor descontado (supressões):	R\$18.108,38
% de aditivos de acréscimo:	1,11%	% de aditivos de supressão:	5,41%
Valor total final da obra:	R\$320.528,40	Valores totais liberados:	R\$246.340,63
Valores à liberar:	R\$74.187,77	% Executado (sobre o valor final):	76,85%
Área construída:	1360,37 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		mai/20	
Unidade Beneficiada:	<b>SEARA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>142/2019</b>	Reforma parcial	
Data da Ordem de Serviço:	03/12/2019	Empresa Responsável:	Lupa Construções Ltda
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	30/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	30/07/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$859.714,26	Valor liberado do CFF:	R\$586.871,55
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$19.916,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	2,32%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$879.630,26	Valores totais liberados:	R\$586.871,55
Valores à liberar:	R\$292.758,71	% Executado (sobre o valor final):	66,72%
Área construída:	1016,84 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>mai/20</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>URUBICI</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>188/2019</b>	Reforma da cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	17/01/2020	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	16/05/2020
Prorrogação de prazo (dias):	62	Prazo de execução com prorrog.:	17/07/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$317.747,13	Valor liberado do CFF:	R\$148.782,89
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$18.672,33	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$493,40	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	5,88%	% de aditivos de supressão:	0,16%
Valor total final da obra:	R\$335.926,06	Valores totais liberados:	R\$148.782,89
Valores à liberar:	R\$187.143,17	% Executado (sobre o valor final):	44,29%
Área construída:	724,98 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>mai/20</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>TUBARÃO</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>211/2019</b>	Climatização das áreas comuns.	
Data da Ordem de Serviço:	27/01/2020	Empresa Responsável:	Termsul Eng. e Serv. Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	26/04/2020
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	25/06/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$423.327,53	Valor liberado do CFF:	R\$371.738,31
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$41.251,64	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	9,74%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$464.579,17	Valores totais liberados:	R\$371.738,31
Valores à liberar:	R\$92.840,86	% Executado (sobre o valor final):	80,02%
Área construída:	5213,69 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD</b>	<b>mai/20</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>TJSC - Torre II</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>180/2018</b>	Reforma da Torre II para remoção de brises, etc	
Data da Ordem de Serviço:	20/12/2018	Empresa Responsável:	Gefisa Const Incorpor Ltda
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	19/05/2019
Prorrogação de prazo (dias):	120	Prazo de execução com prorrog.:	16/09/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$862.332,64	Valor liberado do CFF:	R\$862.332,64
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$862.332,64	Valores totais liberados:	R\$862.332,64
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	13.100,00 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 28/10/2019

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 28/10/2019*




*Fiscalização com auxílio de profissionais da DMTJ*

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA		mai/20	
Unidade Beneficiada:	<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>76/2019</b>	Construção de muro de contenção e cercamento	
Data da Ordem de Serviço:	24/04/2019	Empresa Responsável:	Formatto Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	21/10/2019
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	20/12/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$680.144,59	Valor liberado do CFF:	R\$680.144,59
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$7.968,28	Valor liberado de acréscimos:	R\$7.968,28
Valor de aditivos de supressões:	R\$5.946,33	Valor descontado (supressões):	R\$5.946,33
% de aditivos de acréscimo:	1,17%	% de aditivos de supressão:	0,87%
Valor total final da obra:	R\$682.166,54	Valores totais liberados:	R\$682.166,54
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	5693,66 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 02/12/2019

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 02/12/2019 e definitivamente em 14/04/2020.*

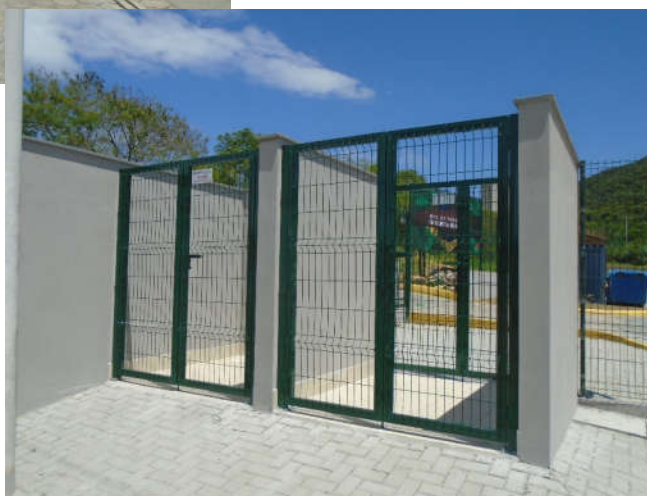

*Fiscalização com auxílio de profissionais da DPRO*

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>mai/20</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>NAVEGANTES</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>098/2019</b>	Conclusão da obra do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	16/05/2019	Empresa Responsável:	JM Gato Constr. Incorp. Ltda
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	12/11/2019
Prorrogação de prazo (dias):	<b>0</b>	Prazo de execução com prorrog.:	12/11/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$2.160.205,26	Valor liberado do CFF:	R\$2.160.205,26
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$2.160.205,26	Valores totais liberados:	R\$2.160.205,26
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	6.857,59 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 12/11/2019

Situação da Obra:

*O Contrato 098/2019 trata da conclusão da obra de construção do novo Fórum de Navegantes que foi iniciada pela empresa Concretel Construções através do Contrato 060/2014 (rescindido). Obra recebida provisoriamente em 12/11/2019 e definitivamente em 10/02/2020.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.



<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>mai/20</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CONCÓRDIA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>160/2018</b>	Reforma dos brises da fachada da edificação	
Data da Ordem de Serviço:	24/07/2019	Empresa Responsável:	AZ Construções
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	21/12/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	21/12/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$276.770,81	Valor liberado do CFF:	R\$276.770,81
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$132.938,43	Valor liberado de acréscimos:	R\$132.938,43
Valor de aditivos de supressões:	R\$33.806,83	Valor descontado (supressões):	R\$33.806,83
% de aditivos de acréscimo:	48,03%	% de aditivos de supressão:	12,21%
Valor total final da obra:	R\$375.902,41	Valores totais liberados:	R\$375.902,41
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	5.363,53 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 15/01/2020

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 15/01/2020 e definitivamente em 23/04/2020.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD</b>	<b>mai/20</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>FRAIBURGO</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>111/2019</b>	Reforma da cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	11/07/2019	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	08/11/2019
Prorrogação de prazo (dias):	120	Prazo de execução com prorrog.:	07/03/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$376.739,26	Valor liberado do CFF:	R\$376.739,26
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$60.455,81	Valor liberado de acréscimos:	R\$60.455,81
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	16,05%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$437.195,07	Valores totais liberados:	R\$437.195,07
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1.421,32 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 06/02/2020

Situação da Obra:




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD</b>	<b>mai/20</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>PONTE SERRADA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>51/2019</b>	Reforma e ampliação para acessibilidade	
Data da Ordem de Serviço:	25/04/2019	Empresa Responsável:	Lupa Construções Ltda
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	22/10/2019
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	20/01/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$594.252,14	Valor liberado do CFF:	R\$594.252,14
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$64.104,40	Valor liberado de acréscimos:	R\$64.104,40
Valor de aditivos de supressões:	R\$33.173,83	Valor descontado (supressões):	R\$33.173,83
% de aditivos de acréscimo:	10,79%	% de aditivos de supressão:	5,58%
Valor total final da obra:	R\$625.182,71	Valores totais liberados:	R\$625.182,71
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	340,00 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 17/02/2020

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 17/02/2020.*

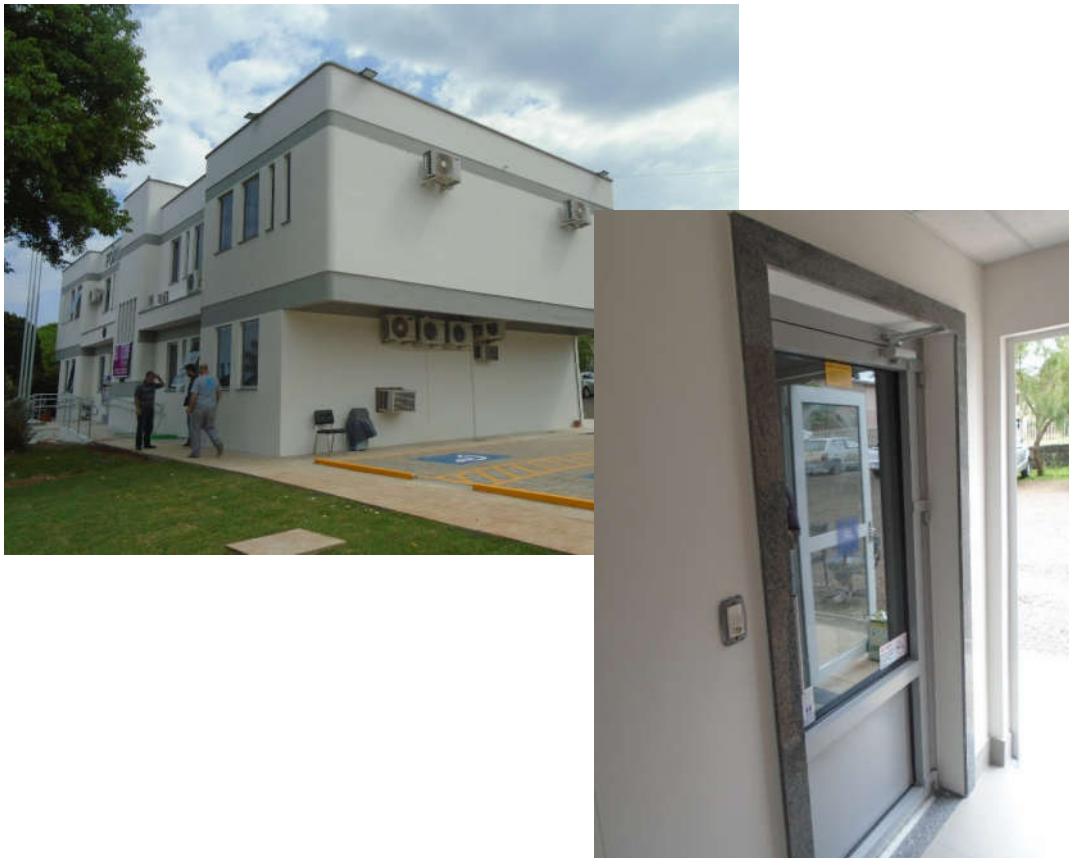

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>mai/20</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>INDAIAL</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>145/2019</b>	Reforma da cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	11/09/2019	Empresa Responsável:	Bortolon Arq. E Incorp. Ltda
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	09/01/2020
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrog.:	08/02/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$286.883,22	Valor liberado do CFF:	R\$286.883,22
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$26.682,54	Valor liberado de acréscimos:	R\$26.682,54
Valor de aditivos de supressões:	R\$23.490,68	Valor descontado (supressões):	R\$23.490,68
% de aditivos de acréscimo:	9,30%	% de aditivos de supressão:	8,19%
Valor total final da obra:	R\$290.075,08	Valores totais liberados:	R\$290.075,08
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1.370,67 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 08/02/2020

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 08/02/2020 e definitivamente em 13/05/2020.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD</b>	<b>mai/20</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CAPITAL - RID SILVA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>147/2019</b>	Instalação de plataforma elevatória	
Data da Ordem de Serviço:	09/12/2019	Empresa Responsável:	Lupa Construções Ltda
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	07/05/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	07/05/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$100.093,58	Valor liberado do CFF:	R\$100.093,58
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$100.093,58	Valores totais liberados:	R\$100.093,58
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1016,84 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 05/05/2020

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 05/05/2020.*




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD** **mai/20**

Unidade Beneficiada:	<b>BLUMENAU - F. UNIVER.</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>190/2018</b>	Reforma e Ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	12/12/2018	Empresa Responsável:	Açu Constr. e Incorpor.
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	07/12/2019
Prorrogação de prazo (dias):	120	Prazo de execução com prorrog.:	05/04/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$1.100.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$1.100.000,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$238.141,89	Valor liberado de acréscimos:	R\$238.141,89
Valor de aditivos de supressões:	R\$21.552,45	Valor descontado (supressões):	R\$21.552,45
% de aditivos de acréscimo:	21,65%	% de aditivos de supressão:	1,96%
Valor total final da obra:	R\$1.316.589,44	Valores totais liberados:	R\$1.316.589,44
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	2916,00 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 27/04/2020

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 27/04/2020. Considerada no prazo em função da paralização do Covid.*

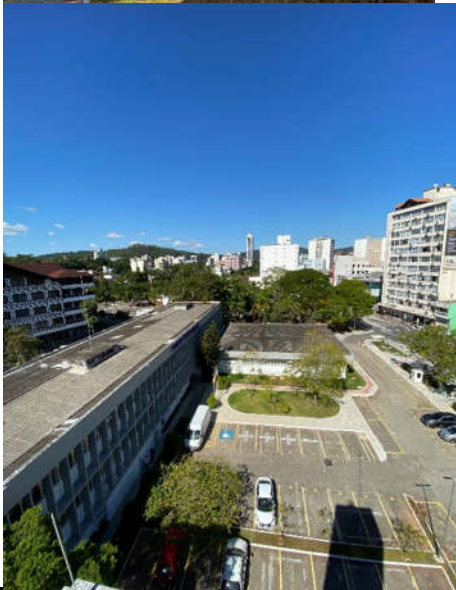

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD</b>	<b>mai/20</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CAÇADOR</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>183/2019</b>	Instalação de rede de fibra ótica	
Data da Ordem de Serviço:	07/01/2020	Empresa Responsável:	Integrasul T. Inf. E Com. Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	06/04/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	06/04/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$393.214,86	Valor liberado do CFF:	R\$393.214,86
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$393.214,86	Valores totais liberados:	R\$393.214,86
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1624,48 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 06/04/2020

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 06/04/2020.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2020</b>	<b>mai/20</b>
---	---------------

Obras iniciadas: 3  
 Obras concluídas (TRP): 6  
 Obras concluídas com TRD: 4  
 Obras paralisadas/rescindidas: 0  
 Obras em andamento: 13  
 Nº de obras no ano: 23

Valores Liberados:		
Janeiro	R\$	1.842.739,69
Fevereiro	R\$	1.856.934,40
Março	R\$	3.014.588,72
Abril	R\$	1.110.969,05
Maio	R\$	1.566.696,49
Junho	R\$	-
Julho	R\$	-
Agosto	R\$	-
Setembro	R\$	-
Outubro	R\$	-
Novembro	R\$	-
Dezembro	R\$	-
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>9.391.928,35</b>



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

*André da Silva*

*Cristiane Batista Tatavitto*

*Diogo Coelho Rocha*

*Herlei José Cantú*

*Rafael Gonzaga Lima*

*Wilson Spernau Júnior*

Engenheiros Eletricistas:

*Nilton Albieri Ferreira*

*Rodrigo André Machado*

Engenheiro Mecânico:

*Robson da Silva*

**Data de atualização: 08/06/2020**

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
